

建
速

第 2 號
11X

湖北省政府稿

總收文
事由

呈送二十四年五月份湖北省建設事業進展表由

成字第 30 號
別文

呈

送達機關

行營

別類

附件

廿四年六月廿九時到秘書處

王永清

成 30

主席



六五

秘書長



六五

秘

書



六五

廳長

六五

秘書長

科股科秘

辦事員

李鵬軒



中華民國二十四年

四月

去文

檔案

月日	月日	月日	月日	月日	月日	月日	月日	月日	月日
時到廳	時擬稿	時送核	時判行	時繕寫	時校對	時用印	時封發	時到廳	時擬稿

字第 3475 號

字第 3475 號

呈

字第

號

案查二十四年四月份湖北省建設事業進展表，業經呈送在案。茲將五月份建設廳主管事業進展情形，編列成表，理合具文賡呈鑒核！

謹呈

國民政府軍事委員會委員長蔣

附呈賡二十四年五月份湖北省建設事業進展表一份

湖北省政府主席張。

中華民國

國

二

年

六

月

監印
高元勳

楊鴻禔

寫

日

13 8

湖北建設事業進展表

二十四年
五月份

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北建設事業進展表二十四 年五月份

造報者湖北省政府建設廳劉○○

建設事業種類	細目	本月份進展實況	備攷
公路	一修築汴粵幹綫	(1) 赴修辛界段橋梁涵洞及開山工程并征工改善該段路基本月月底率可完成不意二十五日山洪冲失材料頗多路基亦受損現正加修約六月	
	二修築京川幹綫	(1) 漢宜路路面分七區施工內陽沙石河兩區因新土未實候經過雨季後再行鋪築外其餘五區本月均在趕鋪中	
	三修築鄂西巴施公路	(1) 全路橋涵開山已完成百百分之四十路基已全鋪	

四、修築鄂南公路

開工趕修

(1) 常通公路基橋涵除兩座大橋外均已完竣

(2) 崇平公路正在佈置開工事宜

(3) 通平公路基開山已完竣橋涵亦已全部開工

五、測量川鄂公路

(1) 自恩施經利川至省邊一百二十九公里已全部測量完竣正趕製路面表

六、復測安白公路

(1) 奉令復測安白公路第一測量隊上月出發往安康則起已測完百分之三十

七、測量均竹公路

(1) 從石花街至房縣分兩隊實測本月約完成百分之七十房縣以西已將楊子江及導淮派隊協測尚未到達(兩委另會)

八、整理已成公路

(1) 擬具漢宜公路幹支綫整理橋梁工程計劃

湖北建設事業進展表

二十一年三月份

造報者湖北省政府建設廳

建設事業種類

細

目本月份進展實況備

攷

電

改

一完成施巴一長途
電線路

該一電線路分兩工程隊
架設一隊由巴東向大
毛田進展一隊由大毛
田向恩施進展于本
月底完成通話

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館



16 X 2

湖北建設事業進展表

年

月份

造報者湖北省政府建設廳廳長

建設事業種類

細

目

本月進展實現

備

改

市

政

一、繼續制修武路
路程

查該路工程已於本月
下旬竣工估計翻修二萬
餘平方公尺

二、繼續修築中山
後馬路

查該馬路工程本月份
下旬已竣工估計翻修二萬
餘平方公尺

三、整理平江路房
屋北遷事項

查該路暫先令各戶
北遷房屋俟款項到
定再行修築現已
派員逐戶標紅以便
按照北遷

四、籌辦廟前路胎

查該路工程已派員而

路事改

戶標紅紙飭令換印
遷房屋并辦理用標
事宜

五五理平陽家陽口
通湘口砥柱樓接
院新修工程
已招標平陽
交還款贍坊有切碍現

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北建設事業進展表 二五五月份



造報者湖北省政府建設廳長

建設事業種類

本月份進展實況

考

農林

調查森林用地

分令各縣行政督察專員轉飭所轄各縣政府遵照森林法第三條及該法施行規則第四條各規定從事森林用地之調查並估計調查期間呈候

案轉

校定棉業改進計劃

建設廳前抄湖北省棉

業改進計劃由本府

審查校定分令棉產

改進處及各縣專員遵照

籌備組織湖北省

棉業改進委員會由建設廳函請全國經濟委員會派員參加並改良委

員會按照湖北省低價業
改裝委員會組織規
程第二條第一款之規
定指定代表一人以便
依章分別選取右關係
方面人員組織成之

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北建設事業進展表 十四年 五 月份

造報者湖北省政府建設廳廳長

建設事業種類

細目

本廳辦理進展實況

攷

鑛

業

一 象鼻山鐵鑛出產 中旬四日天雨下旬四日

鑛砂二千九百七十五噸 天雨均未開工

二 菱給羅時英小

鑛業批出

該商在陽新縣宣化里周 寶山呈請設定小煤鑛之

業權經建設廳依法

核准填就批出報單案

呈咨部核辦。茲准實業

部咨復准予備案此將

小鑛業批出案給該商

具領

三 菱給德樹勛採

鑛批出

該商在原領陽新縣禹 門山煤鑛增加對面山、 牛角龍海口湖等處鑛

四聯委鑒領管理

需洋松枕木

區，並呈請換照，計增區

後其能區面積為五十九

頃五公畝三十八公厘，經

檢同國稅准全業部核

准填表批上，業已轉

委准商其領。

該處代電請購洋松

枕木五千根，係建設區

向產只祥表木竹如數

訂購，所需貨款並經

本府委員會議決准

在該處經常費結餘

項下開支。

枕木五千根價值銀一萬

四千六百一十六元，下力

七百三十元另八角，運

費五百元，共計一萬

五千八百四十六元八角。

湖北建設事業進展表

年 月份

造報者湖北省政府建設廳

建設事業種類

細

自本月份進展實況備

攷

工


業

一、整理電力

成電燈公司

查武昌之成電燈
公司因客竊敗
燈亮不亮音由
本府建設廳以
主整理委員會
以本府技術官
員李捷才由主任
多交建設廳技
正明鵬為省會公
安局長蔡立堅武
昌縣署金楊達夫
該公司經理打
仰為委員並派建

設廠校正所應考科
員羅迪娘分任監
督公司牙尖分列
任職取外書錄之
責任該全每星期
開會一次核應負
責積極督理以期
完善

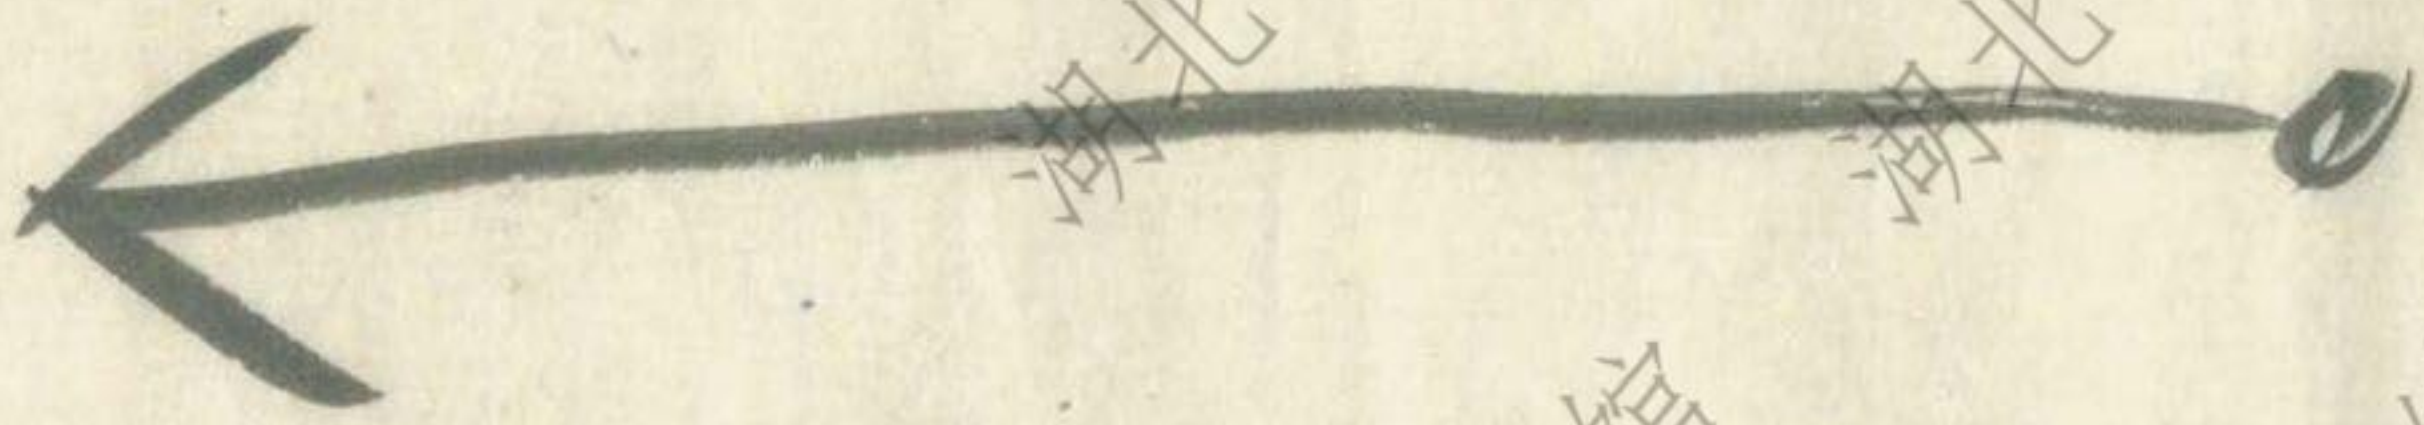

湖北建設事業進展表二十四年五月份

造報者湖北省政府建設廳長

建設事業種類

細

本月份進展實況

考

航

政

(一)修理船隻

(1)輪渡

(2)差輪

(3)航輪

(二)繼續完成平湖門閘
石級輪渡碼頭

晉安建華建德建利建義各輪均分別於本月修理竣工
除建華輪係商廠江漢造船廠承修外餘均機廠修理

宣利建施於本月修竣
武昌機廠修理

新浮陽江通和永德源鎮江利全
前

民新乾泰漢興永利永平義利泰運利義各輪均於本月修竣

因原有石級碼頭橫借行當係用故另建新碼頭俾利乘客起卸已於本月竣工
由本廳省會全工程處指定袁瑞泰建築廠承包由航政處付收
