

稿府政省北湖

建
速

已先發

廿四年八月七
九

成
47

由事文收總

字第

號別文

呈

機送
關達

行營

別類

件附

呈送二十四年八月份湖北省建設事業進展表由

秘書長



八七

秘

書



八七

主席

李鵬軒

七

廳長



秘書長
科股科秘
事員員長長書

李鵬軒



中華民國二十九年

八月六日

月日

月日

月日

月日

八月二十二日

24597
1225

時到
核稿

時繕
寫

時校
對

字第1225號

檔案

號

呈

字第

號

案查二十四年五月份湖北建設事業進展表，業經呈送在案。茲將六月份建設廳主管事業進展情形，編列成表，理合具文賡呈
鑒核！

謹呈

國民政府軍事委員會委員長蔣

卅呈青頁二十四年六月份湖北建設事業進展表存

湖北省政府主席張。

中

華

民

國

二十

の

年

八

月

繕寫

校對

熊昭
培撰

監印

高元勳

日

232

湖北建設事業進展表
二四年
首屆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北建設事業進展表二十四年六月份
造報者湖北省政府建設廳 劉○○

建設事業種類	細目	本月份進展實況	備攷
公路	一、修築汴寧幹綫	(1) 汴寧段各項工程均已全部完成	
	二、修築京川幹綫	(1) 漢宜路路面分七段施工內陳沙石石河兩段因新土未實候經過雨季後再行鋪築外其餘五段本月均告竣工	
	三、修築鄂西施公路	(1) 全路橋涵開山路基已約有百分之五十	
	四、修築鄂西施利公路	(1) 全路測量已畢現正設計中	
	五、修築鄂南公路	(1) 崇陽段計劃崇陽大橋渡脚工程 (2) 崇陽段橋涵設計已畢	

242

六、復測安白路線

七、測量均竹路綫

八、整理成公路

籌劃中並彩色

(3) 通車段路基開山已成

(4) 威通段正測量設計中

(1) 原測溪綫之第一隊外

復加派第三隊協助進

行期早完成

(1) 石花街至房縣一段已全

部測竣

(2) 竹山縣一段已由


委長會調派二隊未部

協測

(1) 擬具各段加蓋橋及

補修鄂東路橋梁木面

等工程計劃

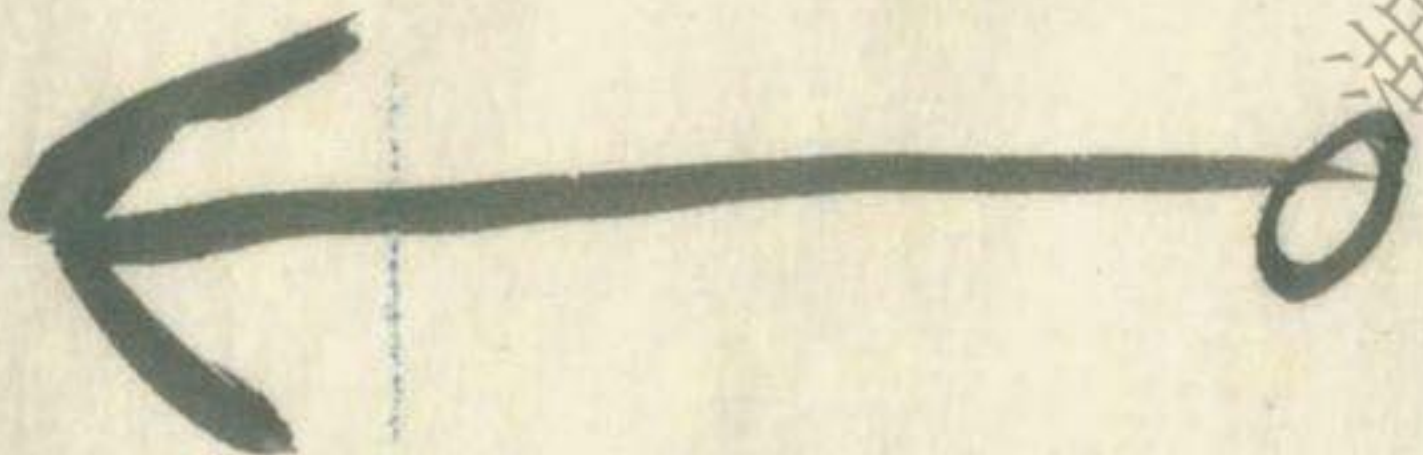

25 22

湖北建設事業進展表 二十四年六月份

造報者湖北省政府建設廳

建設事業種類

目今月份進展實況備

致

中
省
設

一、加平及通城縣
灰多市及白石山
堰市內一里長途
害後鐵路

此兩項工程，于本月
中旬由長途（電報）
經交派收買官房後
主事，工程遂著手
加平及通城縣，定成
灰多市及白石山一
項。



26

湖北建設事業進展表

年 月 份

造報者湖北省政府建設廳

建設事業種類

細

本月份進展實況

備

市 政

一、平陽有金城門及換虎街雄樓橋等處土堆工程

查有金城門等處土堆於交通視瞻均有妨礙上月已招標本月與之平陽

二、繼續調查司下路折遷房屋及攤賣業主戶籍

查該司下路工程計劃已修核定日款未撥要收未動之前已派員調查該路兩旁應折遷房屋及攤賣業主戶籍為未完該本月仍繼續進行

三結束省會工程處

查武昌市政處業經成立所有省會工程處事項應即結束以資武昌市政統歸市政處處理現已電候工程處將文卷悉具備悉款項分別造冊彙報核辦

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

24

湖北建設事業進展表二十四年六月份

七十一

造報者湖北省政府建設廳長

建設事業種類

目本月份進展實況

備考

農林

一、分送農情報告
分令尚未設置農
情報告員之鄂西

等縣政府已就緒
屬各巨內特色相
當合員填表介紹
送寄實業部中央
農業實驗所

湖北建設事業進展表 廿四 年 六 月份

造報者湖北省政府建設廳廳長

建設事業種類

田

目 本月份進展實現

備

致

鑛

業

一 象鼻山鐵鑛出產

鑛砂二千八百九十五噸

下旬連雨僅有三天

出鑛砂

二 枝村能鉄華精

採六次縣東南鄉

龍溪山白珠山等處

硫磺銀主請業

該商呈請改定採鑛

權計鑛區面積三十五

公頃一十一公畝七十一公

釐手續完備已檢同

原資因件時部核辦

三 枝村楊義利請

採六次縣北鄉土

礱堡藕塘坳大山

塹李家冲舒家山

該商呈請改定採鑛權

計鑛區面積三十五公頃

一十公畝手續完備已檢

同原資因件時部核辦

等雷蝶鎖呈請
案

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北建設事業進展表 二十四年六月份

造報者湖北省政府建設廳

建設事業種類

細

目本月份進展實況備

致

工業

繼續整理武昌
成豐燈公司

武昌成豐燈公司
整理委員會除關於
重要事項，開
外，并由該校
改進電廠計劃，
擬具業務整理計劃，呈核施行。

整理第一沙廠停工
份及復工計劃

第一沙廠因虧折停工，引起
勞工糾紛，除囑該廠董
事長迅速設法复工外，本府
并作政府經營之籌劃。

湖北建設事業進展表二十四年六月份

造報者湖北省政府建設廳長

建設事業種類

本月份進展實況

考

航

政(一)修理輪渡

(1)輪渡

航輪

建黃建安建武各輪四號十
號兩號均於本月修竣
泰興新萬安永安裏平鴻
泰林安美壽長林萬達順大
各輪均於本月修竣

武昌機廠承修

(二)派員測勘巴東宜

昌兩處碼頭計劃
設立躉船興辦輪
渡

因已施公路將次告竣宜已一
段決非臨時所能修築格利
用水道聯貫漢宜已施公路
交通已派員測勘完竣計劃設
躉備輪云在進行中

431 28

建

一次要

令指 營行長員委會事軍府政民國

設

考 備 法 辦 定 決 辦 擬 由 事

文別

字第

號

年

月

日

時刻

存查



按呈送二月份建設事業進展表准予備查由

檔案室

總務



中華民國廿八年八月



收到

附

件

號

收文 字第

8805

民國 24 年 8 月 16 日

省建字第 1412

國民政府軍事委員會委員長行營指令

政建陸2 十四年八月十五日發第

復文時請註明此項號

5698

碼

號

令湖北省政府

呈件

為呈送十四年八月份湖北省建設事業進展表由

二十四年八月八日省建秘字第一二二五號呈表均

志准予備查。仰即知照。此令。表存。

中華民國

委員長

蔣中正

廿八年八月十五日

日

黃傳鏞校對

竇宗漢監印
