

105

存

抄存

張立民

王

129

0

中華民國卅六年八月五日

張立民

湖北省公路局

簽呈

中華民國三十六年八月 貳日
鄂路工字第 26858 號

王

據本局第一測量隊代電呈六月份工作旬報簽請核備由

據本局第一測量隊午處交測字第一二九號代電呈三十九年六月上中下三

旬測量工作旬報表各三份經核辦合除指復外理合檢同原表各二份簽請

鑒核備查

廳長

附呈第一測量隊六月上中下三旬工作旬報表六份

備

張立民

張立民印

廳字第 26889 號

校對石階墀

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省公路局利萬公路測量隊工作旬報表

利萬路線 利萬段自利川至卡門 路程約 50 公里

組別 負責人姓名 工作分類 工作數量 月 日 候	選線組		中綫組		水平組		地形組		橫斷面組		備 註		
	定線	比較線	測量	製圖	測量	製圖	測量	製圖	測量	製圖			
	約計公里	約計公里	樁號 起訖	數量 公里	樁號 起訖	數量 公里	樁號 起訖	數量 公里	樁號 起訖	數量 公里		樁號 起訖	數量 公里
	約計公里	約計公里	樁號 起訖	數量 公里	樁號 起訖	數量 公里	樁號 起訖	數量 公里	樁號 起訖	數量 公里		樁號 起訖	數量 公里
6	1	晴										由恩施出發宿長干	
	2	"										自長干出發宿利川	
	3	"										自利川出發踏勘	
	4	"										籌備測量事宜	
	5	"										由利川出發踏勘	
	6	"										踏 勘	
	7	"										" "	
	8	雨										" "	
	9	晴	2	2	0.0K 2.0"	2	0.0K 2.0"	2	0.0K 2.0K	2	0.0K 2.0"	2	測 量
	10	"	3	2	2.0K 4.0"	2	2.0K 4.0"	2	2.0K 4.0K	2	2.0K 4.0"	2	" "
工 作 效 率	本旬合計		5		4		4		4		4		
	連前總計		5		4		4		4		4		
	完成百分率		10%		8%		8%		8%		8%		
	預計完成日期		7月10日		7月10日		7月10日		7月10日		7月10日		7月10日
沿綫情形調查概況	經過城鎮名稱及戶口		利川縣城人口約20,000										
	路面及其他建築材料供應情形		路面材料3處總開採木料極易										
	重要出產物及經濟概況		產桐漆藥材福豆包谷糧食交通不便經濟失調										
	工程進行難易概況		除石方外無他難工										

局 長



總工程司
副總工程司


工務科長



測繪股主任



第一測量隊隊長

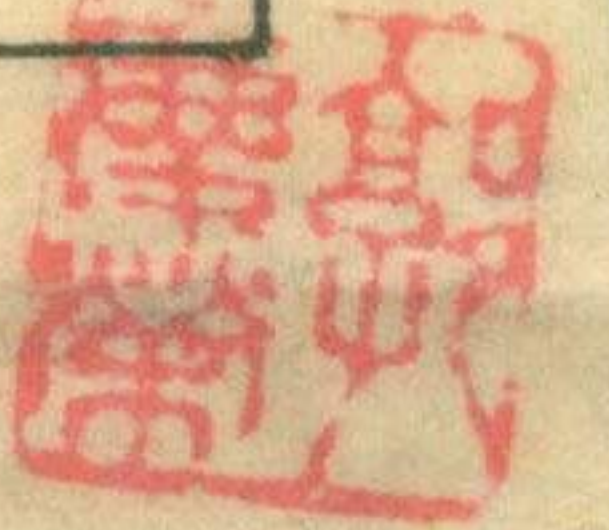

106

湖北省公路局利萬公路測量隊工作旬報表

恩利萬路線 利萬段自利川至卡門 路程約 50 公里

36年 月 日 候	組別 負責人姓名 工作分類 工作數量	選線組		中綫組		水平組		地形組		橫斷面組		備 註		
		定線	比較線	測量	製圖	測量	製圖	測量	製圖	測量	製圖			
		約計公里	約計公里	樁號 起訖	數量 公里	樁號 起訖	數量 公里	樁號 起訖	數量 公里	樁號 起訖	數量 公里		樁號 起訖	數量 公里
6	11	雨	2	2	4.04 6.04	2	全左			全左				
	12	晴	3	2	8.24 8.24	2.2	"			"				
	13	雨	2	1	9.84 9.84	1.6	"			"				
	14	晴	3	2	11.84 11.84	2	"			"				
	15	雨	2	1	13.04 13.04	1.2	"			"				
	16	晴	3	3	15.04 15.04	2	"			"				
	17	"	2	3	18.04 18.04	3	"			"				
	18	"	3	2	20.04 20.04	2	"			"				
	19	"	3	3	23.04 23.04	3	"			"				
	20	"	3	2	26.04 26.04	3	"			"				
工作本旬合計			26			22								
工作連前總計			31			26								
效率完成百分率			62%			52%			52%			52%		
預計完成日期			36-7-10			36-7-10			36-7-10			36-7-10		
沿綫情形調查概況		經過城鎮名稱及戶口 雲上人口約2000 南坪人口約5000 路面及其他建築材料供應情形 路面材料就近河採木料較少 重要出產物及經濟概況 桐漆蕪林色谷稻豆 工程進行難易概況 除石方外無他難工												

局長



總工程司
副總工程司


工務科長



測繪股主任



第一測量隊隊長

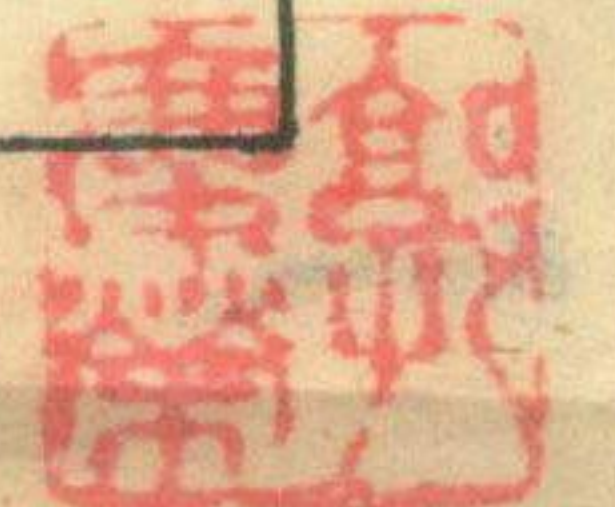

101

湖北省公路局利萬公路測量隊工作旬報表

利萬路線 利萬段自 利川 至 宜都 路程約 50 公里

月	日	候	選線組		中綫組		水平組		地形組		橫斷面組		備註
			定線	比較線	測量	製圖	測量	製圖	測量	製圖	測量	製圖	
			約計公里	約計公里	樁號起訖 數量公里	樁號起訖 數量公里	樁號起訖 數量公里	樁號起訖 數量公里	樁號起訖 數量公里	樁號起訖 數量公里	樁號起訖 數量公里	樁號起訖 數量公里	
6	21	晴	2	1	28.00 28.00	2	全左						
	22	"	2	2	28.00 31.00	3	"						
	23	"	2	2	31.00 34.00	3	"						
	24	雨	1	2	34.00 35.00	1	"						
	25	"	1	1	35.00 36.00	1	"						
	26	"	2	2	36.00 37.00	1	"						
	27	"	2	1	37.00 38.00	1	"						
	28	晴	2	2	38.00 42.00	4	"						
	29	"	2	3	42.00 45.00	3	"						
	30	"	0.737	0	45.00 47.737	2.737							
工作 效率	本旬合計		16.737			2.737							
	連前總計		47.737			47.737							
	完成百分率		100%			100%		100%		100%		100%	
	預計完成日期		36-7-10			36-7-10	36-9-10	36-7-10	36-9-10	36-7-10	36-7-10	36-9-10	36-9-10
沿綫情形調查概況			經過城鎮名稱及戶口		興勝場人口約2000								
			路面及其他建築材料供應情形		路面材料就地可採木料亦可就近採運								
			重要出產物及經濟概況		桐漆藥材包谷稻								
			工程進行難易概況		須跨越500公尺高之青嶺山及150公尺高之南清雄關盤旋曲折工程較難								

局長

總工程司
副總工程司

工務科長

測繪股主任

第一測量隊隊長

011
