

湖 北 省 政 府

中 華 民 國

1937

年

月

日

起 止



本 省 各 行 政 區 第 一 期 建 設 中 心 工 作

第

類

第

項

第

目

第

建 22

號

次

本

10

湖 北 省 政 府 建 設 廳

案

總 類 196 號

編次

事

核
行
政
流

八
區
考
覈

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

由

年
月
日
文
號

30036 27619

號 附
碼 件
數 附
目 件

附

註

湖北省档案馆

本案共文

件附件

件

建循

湖北省政府稿

登

呈送省長及行政院
 呈報三官年四月初一日起呈送三官年底之各期建設
 中心之作務之計劃及實施表並請存封抄送
 抄報各官核由

來文

字第

27619 號

文別

指令

送達

第一區行政督察專員

蔡

南

院

呈

機關

行政院

別

件

附

附錄

事由

呈報三官年四月初一日起呈送三官年底之各期建設
 中心之作務之計劃及實施表並請存封抄送
 抄報各官核由

秘書長

秘書

秘

書

三十一

主席

主席

三十一

廳長

廳長

秘書科 技股 科技科 辦

書長 正 長 士 員 事 員

童鍾

中華民國

| | | | |
|---|---|---|----|
| 月 | 日 | 時 | 到廳 |
| 三 | 月 | 時 | 擬稿 |
| 月 | 日 | 時 | 送核 |
| 月 | 日 | 時 | 判行 |
| 月 | 日 | 時 | 繕寫 |
| 月 | 日 | 時 | 校對 |
| 月 | 日 | 時 | 用印 |
| 月 | 日 | 時 | 封發 |

檔案 字第

27619 號

指令

有建二案第

第

令第八區行政督察室主任周麟書

一千九百四十一年一月一日署肅字第一八號呈件（呈報呈書）

呈件均悉。查核各表，大致尚合，惟電報初份，

仍應將已成路線路位照圖，此者，各縣鄉鎮長途電

訊性質，調查表式，填明並附路線圖，呈核修

濟塘堰部份，亦應抄照本府建設廳前頒調查塘

堰表式，填明調查表，分別填報價值。查報事，

除分別抄報，並呈報。

行政院定核外，仰即遵照，此布。理具報為要！



答。

主席黃○○

建設廳長張○○

有連三字第

號

呈

案據第八區行政督察委員周麟書二十五年

三月廿日呈署請字第一九〇號稱

案查二十四年四月一日起至二十五年六月底

止各期中區工作業經先後核定計劃

依無新領表式分別補填齊全存具文彙

呈鈞者呈在封字為公便



2

甘肅，計呈責二十五年四月一日起至二十五年六月月底止各
期中，各作款會計別及實施報告表表每期各九份
撥出，查核者表，（指）分別填報備查。

我身身身時，除程志年揚令等外，辦理各核同條表

呈送

行政院審核

謹呈

行政院長蔣

財呈第... 二十四年四月一日起至二十五年六月月底止各

期各九份
期各九份
期各九份



3

湖北省政府主席黄



湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

中華民國

年四月

繕寫

校對 陳瀛洲

監印 高元勳

日

塘修路

次要

建設

第一科路政

四月四日起至五月六日截止

章

湖北省第八區行政督察專員公署 保安司令部 呈 湖北省政府

| | | | |
|----|----|----|--|
| 考備 | 示批 | 辦擬 | 事由 |
| | | | 為遵照新頒甲乙兩種表式改填二十四年度各期建設中心工作 報告表補呈 鑒核存轉由 道路部 經核尚無不合 應請部核核尚無不合，惟應將已完成線路填具湖北省各縣 鄉鎮長途電話情形調查表，並附具線路圖，呈備考查。 修濬塘堰部：查核尚無不合，惟應將中修濬塘堰表，及修濬塘堰表， 分別填報核 中華民國二十五年三月廿七號收到 三月廿七號 表十八份 附件男體 圖文附送 附 件 號 |

呈署肅字第 號

四月四日起至五月六日截止

年 月 日 時到

省建字第 27619 號

收文 字第 號

案查二十四年各期中心工作，業經先後擬定計劃，呈奉

鈞府指示興辦在案。查原第一期中心工作，架設由專員公署兼鄖縣縣政府至所轄各縣政府之電話綫，係奉

鈞府省秘總字第零零三九號訓令暨省建二字第三七九二號指令，准以整個計劃辦理，故所轄各縣未便分別呈報，仍以區為單位表報。第二期中心工作，係

本區所轄各縣府至各區公署之電話支綫，亦經表報興辦。第三期中中心工作，原修復舊有縣道及補架電話綫，均經擬具進行辦法呈報。第四期中中心工作，原

擬修濬塘堰，嗣因奉令修復老白公路，故以修濬塘堰，修復公路為第四期中工作，第五期原擬補修由縣城至各區署之道路，但均鄖三縣，仍續加工

修復老白公路。以上各項工作實施情形，如電話綫架設八百零五華里，已

4

5
完成通話。補修縣道一千二百一十華里。修濬公共較大塘堰一十九所（民間私有塘堰於大水後已令各縣區一律修復）修復各區署道路一千二百五十五里。修復老白公路二百八十里。總計各項工作實已完成十分之八！其有未完工程，或因地瘠民貧，經濟異常困難！或因地處邊陲，鄰匪時有竄擾，種種原因，致未能一一如期辦竣！此等特殊困難情形，迭經詳呈，諒邀

垂鑒，除未完工作，仍列入下期一律補辦外，緣奉令飭，理合將二十四年度各期中心工作預訂計劃及工作實施各情形，依照新頒表式，分別補填齊全，二併具文彙呈

鈞府鑒核存轉，實為公便！

謹呈

湖北省政府主席黃

計呈賚

二十四年度第一期至五期建設中心工作

預定計劃
實施報告

表每期各九份

湖北第八區行政督察專員關麟書



湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案

湖北省檔案

湖北省檔案

中華民國



六

日

修定
增修

湖北省第八區二十四年度第一期至五期建設中心工作
預定計劃表
實施報告表

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆


湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

7



湖北省第八區二十四年度第一期建設中心工作預定計劃表

項 目 預 定 計 劃 進 行 步 驟 備 考

架設由專署派員遵照二十四年二月
鄂縣縣政府呈 湖北全省行政會
所轄各縣政府 議議決本區提擬
之電話幹線。

擬具各縣均確 本府修通令自二十四
年四月一日起至六月底止
經費數目表經 呈報後通令各縣
籌款繳署購 以區為單位整併計
辦與修。 劃故各縣未便分呈
本表仍以區為單位
查填合併註明。

話為建設中心工
作擬定後當擬計
劃呈奉

令各縣征集本
碑沿路線分屯
齊全以便架設。

省政府秘書總字第
零零九三號訓令核

齊全以便架設。

子

定計劃大綱如下：

1. 查勘綫路共計

一千三百四十里。

2. 租用電桿共計

一萬二千零六千

三根。

3. 共需材料費洋

七千八百八十三元。

4. 共需人工費洋四

百二十元。

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省第八區二十四年度第一期建設中心工作實施報告表

項 目 原定計劃辦理情形備考

架設白馬灣署至
一、總路共計壹千
一、催各縣籌繳
一、本期係遵令自二十

彭縣縣政府至
三百肆拾里。
撥款業經彭縣
四年四月一日起至六月

新轄各縣政府
又、電桿共計伍用
本期內已籌
底止。

之電話幹線。
壹萬貳千零陸
繳伍百元。
又、今期完成電話線

拾叁根。
又、催各縣征桿
壹百肆拾柒里。

三、材料共需洋柒
業經彭縣已征
三、查本期中心工作計

千捌百捌拾叁
元。 也業經各縣
劃於二十四年六月七

元。
期首縣已征完
日始奉 省府二十

中人工共需洋肆百
伍百叁拾根。
四年六月一日建二字

貳拾元。

五、鄂省鄂縣至鄂

西縣城之電話

綫已架設完成

通話計壹百肆

拾肆字。

訓令轉奉 由昌行營

指令核准辦理加以

本區住居鄂北昆連

豫陝川邊境內多

山交通極感不便又

因素甚清苦隣省路

匪時礙以致各縣籌

款困難故本署竟完

成電話綫壹百肆拾

華里除尚未備辦齊

全合併註明。

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省第八區二十四年度第二期建設中心工作預定計劃表

項

目 額 定 計 劃 進 行 步 驟 備

考

本區所轄各縣政
府至各區公署之
電話支綫。

根據二十四年一月湖
北全省行政會議
本區提議以建設

以上預定計劃除
分呈外並以時間關
係已令各縣遵照

辦理。
本項係自二十四年七月
一日起至九月底止。

各縣政務處至所轄
各縣城之電話幹
綫為第一期中心
工作即以建設由
各縣府至各區署
之電話支綫為第

三、心工作以便完成
全省電話網。

凡所有各縣府及各區

署之路線電桿等器

材全等項經費

應由各縣府詳細

計劃後呈請核辦

請核後辦理。

三、其一部分之經費

應由各縣府即可利用

於該縣木塔等不

必另征電桿。

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省第八區二十四年度第二期建設中心工作實施報告表

項 目 原 定 計 劃 辦 理 情 形 備 考

本區所轄各縣政府
府至各區公署之電
話支綫。

以繁鄖縣至本區
所轄各縣政府之
綫為幹綫以各
縣府至各該區公署
之綫為支綫俾完
成全區電話網。

繁鄖縣計劃已呈准
其他各縣尚在擬辦中
已由繁鄖縣城經天堰鎮
至南化鎮之綫計長壹
百零拾里又自縣城經
十堰鎮至黃龍灘之
綫計長壹百叁拾里

本期自二十四年七月一
日起至九月底止。
本期架設完成通話
之電話綫共計長四
百七十里。

經費概不人工
等項均由各該
縣計劃呈核

均已架設完竣通話。

均縣內縣城經草店

辦理。

3. 支線與幹線

同路即可搭

線不必另征

持本。

至六里坪計七十里已

架設完成通話。

中鄭西縣城至上海之

電線總計長

已架設完成通話。


房縣竹山鄰省

現擬特撥籌款因

難尚未架設。

6. 竹山已籌款正在

縣社架設中。



湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省第八區二十四年度第三期建設中心工作預定計劃表

項 目 預 定 計 劃 進 行 狀 況 備 考

1. 修復舊有縣道
2. 通車
3. 備文呈報備考
本期自二十四年十月一日起至十二月底止。

行政會議建議應由各縣遵照人民日報備核。本期原擬以修復舊有

縣道為中心工作因一二

作應修之縣道多不


過九餘公里不過五餘

不過四百公里短不過

壹百餘公里之原則規

定參酌地方接連豫

陝川邊交通不便情

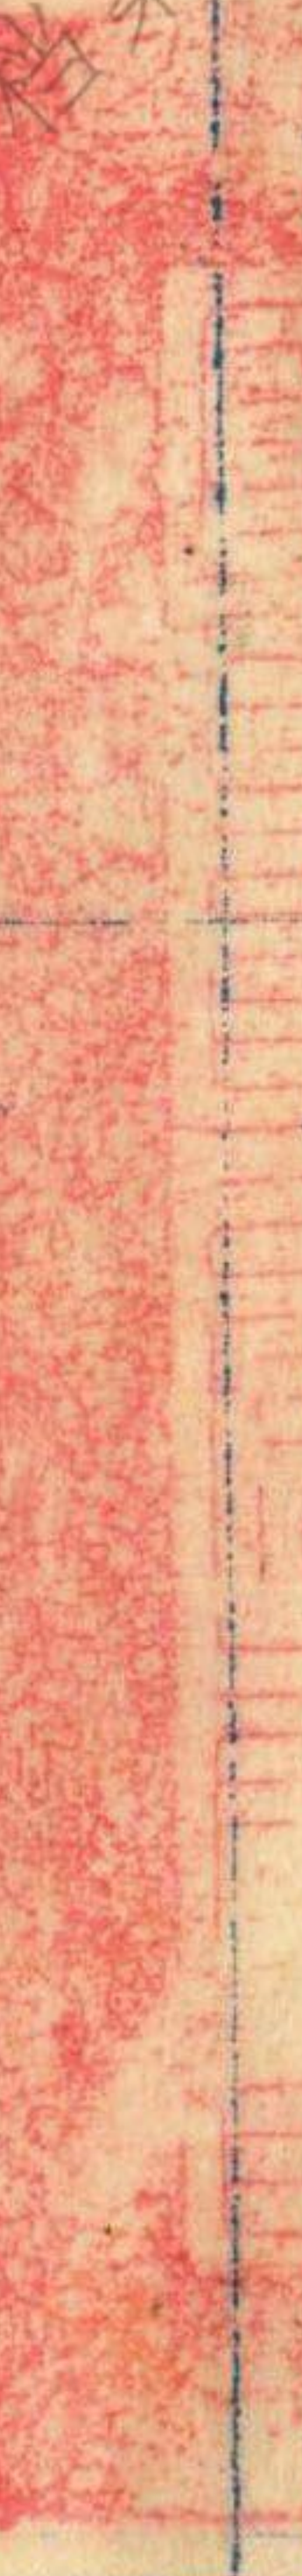

形除架設電話為三

期中心工作外應以修

復縣道為第三項中

的工作。

見應修之縣道名稱

里數經過地點與負

責之縣道分

列如下

(一) 均道

自鄖縣城經遠河

至均縣城計長壹百

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

氣谷里由鄭均西縣
負責修築。

(二) 鄭竹道。

自鄭縣城經鮑家店
西河口至竹山縣城計
長叁百陸拾里由鄭竹
西縣負責修築。

(三) 竹房道。

自竹山縣城經陳家
鎮下店子至房縣城
計長壹百捌拾里由
竹房西縣負責修
築。

(四) 房青道。

自房縣城經馬道至
青峯鎮計長玖拾里

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

由房縣負責修築。

五) 竹谿道。

自竹山縣城經溢水寶

豐水坪至竹谿縣城計

張壹百捌拾肆里由竹山

竹谿

六) 鄂州道。

自鄂州縣城經西遠河何

家店至鄂西縣城計長

壹百肆拾里由鄂西縣城

西向鄂州縣城修築

七) 西河道。


自西河縣城經漢雲

鋪至西河鎮計長壹

百肆拾里。

以上各路共計壹千

貳百壹拾里。



湖北省档案館

湖北省档案館

湖北省档案館

湖北省第八區二十四年度第三期建設中心工作實施報告表

項 目 原 定 計 劃 辦 理 情 形 備 考

1. 修復舊有縣道。
2. 補架電話綫。

1. 遵照省建設廳案
指定應修之縣道及
修訂地方情形擬定

1. 遵照省建設廳案
列各縣道已由各縣
於農隙時會同征工
修復完竣。
本期修復縣道共計長
壹千貳百壹拾柒里補架
電話綫壹百玖拾伍里已
完成通話。

本區第三期中心

修復完竣。

壹千貳百壹拾柒里補架

工作如下

又補架竹縣電話綫

電話綫壹百玖拾伍里已

2. 應修之縣道名稱

計由縣城東至縣河
完或通話。

(一) 鄭均道

舖六十里西至關垵子

(二) 鄭竹道

計六十里南至十里至

(三) 竹房道

楊柳樹又七十里至黃

(四) 房音道。

(五) 竹谿道。

(六) 鄭西道。

(七) 西津道。

以上各路共長壹千

貳百壹拾里其經

過地點及各長若

下詳本局預定

計劃表內。

狗溪又二十里至泉溪

又二十五里至張家山

又三十里至廣龍灘共

計長壹百九十五里已

於本局內一律架設

完成通話。

湖北省第八區二十四年度第四期建設中心工作預定計劃表

| 項 目 | 預 定 計 劃 | 進 行 步 驟 | 備 考 |
|------------------------------|--|--|---|
| <p>1. 修濬塘堰。 必修復老白公路。</p> | <p>本區轄境多山常 有旱潦不均之患 鄉民類皆利用山 溪為灌溉之資對 於塘堰工作素不 加注意純任自然 雨水無以節調茲為 救濟農田應以督飭 修濬塘堰為本區</p> | <p>人根據縣續修濬塘 堰條例各縣先行 調查原有塘堰由所 近有關三保及民眾 分別負擔修濬由該 地段內區保甲長 實行督修。</p> | <p>本期自二十五年一月一 日起至三月底止。 原定計劃修濬塘堰現 奉 省府令飭省公路局 派員前來修復老白公路 故補以修復公路為本期 工作之一。</p> |

第四區中心工作。

溉之處相度地勢建築

堰閘所需石工材料等

項統由利善縣條之地

無設法亦但總以地方

必需急堰塘民力財力

糾能勝任修濟者為

實

今令飭老白公路經過

三縣均鄰西等三縣

預備整修一切

事宜。



湖北省第八區二十四年度第四期建設中心工作實施報告表

項 目 原 定 計 劃 辦 理 情 形 備 考

1. 修濬塘堰。
本區轄境多山常有旱潦不均之患鄉民
凡修復老白公路。
類皆利用山溪為濬
既之資對於塘堰工作
素不加注意則純任自
然雨水無以節調故為
救濟農田應以督飭修
濬塘堰為本區第四
期中心工作。

1. 崇陽縣已修濬東
屯溪西屯堰大堰十堰
蓮花池府側塘青蓮塘
等。
2. 鄂西已修濬花莊塘
鋪河堰張公堰黑龍
堰陶家堰等此堰。

3. 竹谿縣已修濬清水
塘廖家塘楊家塘等
家塘趙家塘陳家塘
出竹山房縣均縣已修
之堰尚未具報正展

催中。

分修復共白公路一切準
備完竣均鄭三縣已
於本期內先後開工
計均縣境內應修復
路線約九十里鄭縣
境內應修復路線約
二百里鄧西境內應
修路線約五十里至
於工程以鄭縣為最
艱鉅鄭西次之均縣
又次之詳細工程情形
係由省公路局主辦
本區只負征工修復
之責合併註明。

湖北省第八區二十四年度第五期建設中心工作預定計劃表

| 項 | 目 | 預定計劃 | 進行步驟 | 備考 |
|--|--|---|---------------------------|---------------------------|
| <p>1. 補修由縣城至各區署之道路。 又續修老白公路幹綫。</p> | <p>1. 查本區多雨交通不便加以大雨為災道路多被沖毀弱雖修復繼被雨水沖毀之處仍多應即補修以利交通故本期以補修縣城至</p> | <p>1. 修復縣城至各區署之道路名稱由各縣酌量地方情形辦理具報憑轉。</p> | <p>本期自二十五年四月一日起至六月底止。</p> | <p>本期自二十五年四月一日起至六月底止。</p> |

各區署之道路
為第五期中心
工作。

是令催沿路各縣

區加緊趕修者

白公路幹綫。

期修復勿事舖

張務須酌量民

力財力期收確

實之效果。

令飭屬均三縣

分段加工趕修

老白公路。



湖北省第八區二十四年度第五期建設中心工作實施報告表

項 目 原定計劃辦理情形備考

1. 補修由縣城

1. 查本區多山交通

1. 蔡關路計七十里又轉
至三區署南化鎮路線
計六十里又由城至三區
署十里鎮路七十里又
由城至四區署黃龍鎮
路一百里均已補修完竣
其餘未修完竣之公路下期
繼續辦理合併註明。

至各區署之

不便如以上年大

水為災道路多

被沖毀嗣因修

復老白公路貳百捌拾里其

道路。

獲繼續被雨水冲

毀之處仍多應

即補修以利交

2. 續修老白公

路幹綫。

通故本期以補

修縣城至各區

路幹綫。

已補修。

3. 均縣由城至六里坪之路

計七十里又由土橋至三官

即補修以利交

城至得勝鎮計六五里均

已補修。

通故本期以補

修縣城至各區

路計七十里又由土橋至三官

已補修。

均縣由城至六里坪之路

計七十里又由土橋至三官

修縣城至各區

路計七十里又由土橋至三官

已補修。

18

署之道路為第

五期中心工作。

公令催沿路各縣區

加緊趕修老白

公路幹綫。

殷之路計百十里又由槐

樹崗至在設之路七十又

由曹家店至玉皇頂之路八

十里又由丁家營至浪河鎮

之路計十里均已補修。

火房縣魚池至青峯鎮之路

計長九十里現已補修。

分竹山由城至寶豐之路計

長九十里現已補修。

分竹路由縣城至水坪

二區署三十里由城至三

區署泉溪一百二十里又

由城至四區署廣龍

灘七十五里均已補修。

分均縣境內老白公路毀

壞地點較大本期已修

19

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

復完成計九十里

西境內路毀雖短工

程甚艱本款已修

復十分之七計四十二

兼鄂縣境內路毀

最長二程最以五期

已修復十分之八計

壹百零五里。

20

中華民國

二十六年五月



日漢法第八區行政督察專員關麟書

