

登建

連

總務



廿四年三月六日
時到秘書處

周化南

趙幼黃

湖北省政府稿

來文

呈送二十四年十一月份湖北省建設事業進展表由

急字第一分號

別文

呈

機送

行管

別類

件附

事由

秘書長



秘書



三六八

主席



湖北省檔案館

廳長



秘書長
秘書長
股科長
科員
辦事員

錢友松



中華民國二十四年

十二月廿九日
三月廿二日
又月又日
又月又日

民國二十四年十二月二十九日 20時到
建字第一分號 4444

檔案字第一號

廳稿核行

呈
字第 號

案查二十四年十月份湖北建設事業進展表、業經呈
送在案。茲將十一月份建設廳主管事業進展情形、編列
成表、理合具文呈
呈核！


謹呈

國民政府軍事委員會委員長蔣

附呈賚二十四年十月份湖北建設事業進展表一份

湖北省政府主席張

中華民國

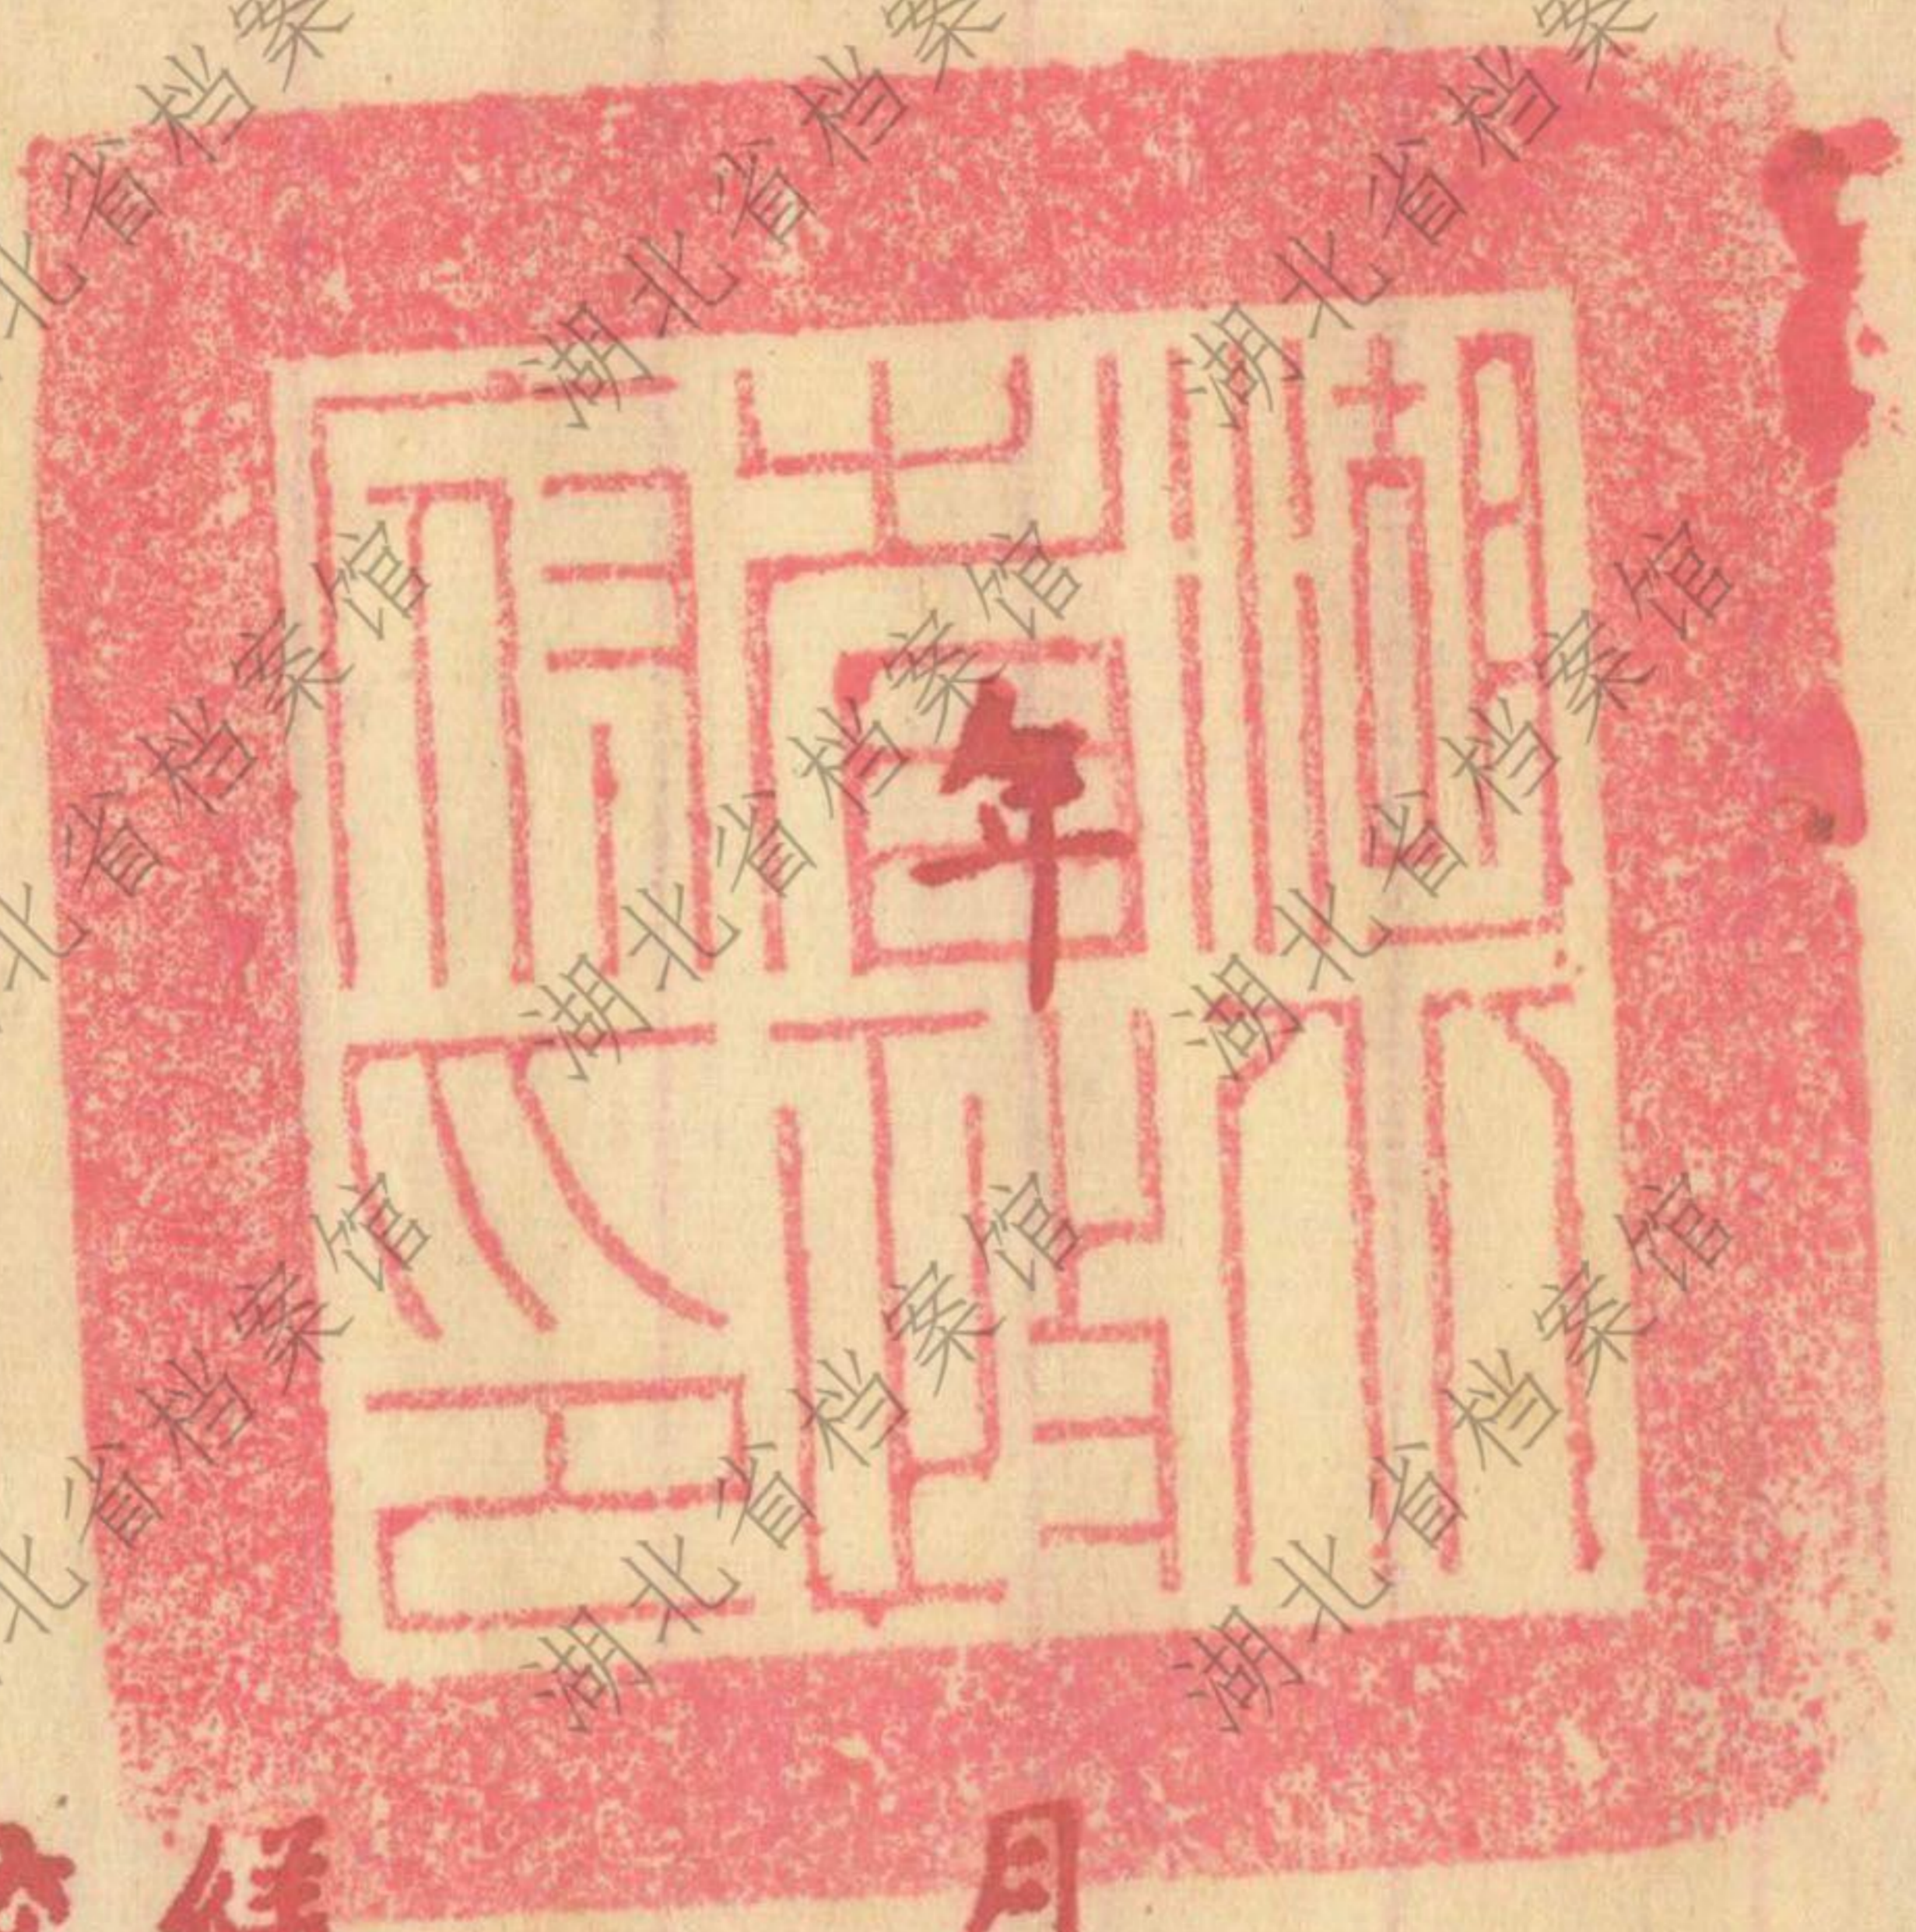

月

日

繕寫

校對

熊昭祺
陳遠洲

監印 高元

91 2

湖北建設事業進展表

二十四年

十一月份

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北建設事業進展表 二十四年 十月份

造報者湖北省政府建設廳廳長

建設事業種類	細	目本月份進展實況	備
公路	京川幹綫	<p>(1) 漢宜路面水冲工程尚未修復進加經費未核定故現係已成三處外餘均僅能採運石子</p> <p>(2) 巴施路巴車碼頭壘船已建成路面工程亦已興工</p> <p>(3) 滹園園柳兩區均已查勘完畢正在設計中</p> <p>(1) 施末路已全部測畢各項工程正在向前推進中</p> <p>(2) 宜五路已派測量隊前往測量路線</p>	致
公路	鄂西公路		



鄂南公路

整理已成公路

(1) 崇平路各項工程均

在積極趕修直城至

省界一段已測量完

畢

(2) 陽界段進行表色并

籌修路基

(3) 陽新段進行表色并

籌修路基

(1) 補修各段水冲工

程

(2) 籌備鄂西恩施及鄂

南崇通諸段之通

車營業

82

湖北建設事業進展表二十四年十一月份

造報者湖北省政府建設廳廳長

建設事業種類

電政

細

繼續修理被水冲
毀各段長途電
線

目本月份進展實況

修復河西幹線黃龍
灘至沙河石谿幹線
保康至房縣各段
電線

備

攷



84

湖北建設事業進展表二十四年十一月份

造報者湖北省政府建設廳廳長

李宗平



建設事業種類	細	目	本月份進展實況備
水利	<p>全飭湖北省水災救濟委員會及各縣工賑會等民堤</p>	<p>查本省左列民堤係因江漢兩岸幹渠潰決被冲成口甚多或長上被風浪洗應加高培厚投修各處查勘墾之</p>	<p>年委員報告各縣民堤潰口計五至二個潰口正長及共為七四三六三三市尺修復後應需土方共為二七三五五八四三市方應加高培厚之堤僅比洪水位加高三市尺共需土二三九三四九九三三</p>

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

致

四市方加高培厚不及
二市尺高之堤共需土
四八三四一二三四市亦全
仍開井者水突故廣挖
會分派各委工賑以收以
二代賑修築民堤

派員分途會同
勘估河漢兩岸
特設下層工程
驗收本屆限之

准經委會函收復之
程申司史道培及水
利支技士張廷相加
士吉前前往後估下
限之監驗收本屆已
定工程清收會同前
往赴國經派本府初
事之委技術室專員
陳鴻泰建設廠技士
吳松壽湖北方公路
工程支工程師張昭德
會同前往辦理

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

85

湖北建設事業進展表二十四年十一月月份

造報者湖北省政府建設廳廳長



建設事業種類

農林

細

目本月份進展實況備

攷

考選合作指導員

奉 國民政府軍事委員會委員長蔣江秋京電為各省有應選送大學或專門學校畢業現任合作指導員工作人員兩人赴中央政治學校合作學院研究由兩令飭農村合作委員會迅即規定資格同單保送一俟初試適宜即行送往該院。

轉頒私立養雞場登記暫行規則

實業部為改進養雞事業並保持雞蛋對外貿易起見檢同公布之私立養雞場登記暫行規則咨請查照轉飭遵照仰各縣府台各

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

臣行政督察专员汉口
市政府及武昌市政府
遵照，立布告周知。

86 22

湖北建設事業進展表 七四年十一月份

造報者湖北省政府建設廳

建設事業種類	細	日本月份進展實況	備
鑛業	<p>一 象鼻山鉄鑛出產銀砂一萬六千九百噸</p> <p>二 轉峯港江澤鑛業執照</p>	<p>上旬出銀砂五千五百五十五噸中旬出銀砂四千八百七十七噸下旬出銀砂五千六百四十五噸</p> <p>該商請採京山縣東鄉公安砦袁家坡塔山石膏鑛經業部核准發執照當特給具領令縣政府保護並核同登記事</p>	攷

項表報部備查

三、通令嚴限催

繳欠稅

奉實業部令以各

鎮商應繳本年下期

鎮區稅及以前積欠

應從嚴勒限催解

經通令限期本年七

月底一律繳清

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

87

建設進展表

十一月份

建設事業種類

細目

本月份進展實況

備

改

工業

設立乾式軋花

本府建設廳提案於老

打色廠

河設立乾式軋花打色

廠一案經本府委員會

第一七五次會議決議通

過經會撥款二萬元

照原擬計劃開辦

湖北建設事業進展表 二十四年 十一月份

造報者湖北省政府建設廳廳長

建設事業種類	航
細	政(一)修理輪船
本月進展實況	(一)輪渡 (二)內河航輪
備	<p>建漢建華武安建夏四輪均於本月交廠修理一次，益和保全華利致遠福新新萬安襄平林安新乾泰泰興漢東等十一輪及租用之六十二號六十七號兩躉均於本月交廠修理完竣。</p>
致	武昌機器廠承修
<p>(二)派板佐帶挖泥船疏濬藕池口至外江之泓道</p>	<p>藕池口至外江沈家腦洋船碼頭河道向被流沙淤塞，每年春冬江水低落大小輪船帆船不能直抵藕池，祇</p>
<p>該項泓道應挖去土方約計五千餘方，均須轉運口外拋棄，不宜仍置泓道兩旁，以該挖泥機</p>	

88

能停泊外江洋碼頭，再由藕池與洋碼頭同旱路數里，以人力轉運，商旅苦之。每於本月二十日派拔佐帶挖泥機船及拖輪駁船前往疏濬，務使航輪得由外江直駛藕池，則便利交通，實非淺鮮。

每點鐘挖泥能力計算，須二十餘日方可竣工。
