

水利股

湖北省水利工程處呈

事由

據第五水利工程勘測隊呈請該隊本年元一六月份八項中心工作月報表祈鑒核一案呈請鑒核由

案據第五水利工程勘測隊呈請該隊本年元一至六月份八項中心工
作月報表祈鑒核等情經核尚合除抽存外理合檢同原表三份備文

呈請

鈞廳鑒核備查

呈

呈

建設廳廳長譚

附呈第五勘測隊本年元一六月份八項中心工作月報表各二份

湖北省水利工程處處長沈友銘

存

54



0251 號

湖北省第五水利工程勘测

湖北省水利廳中心工務月報

項

月

原定計劃

情形

進展比較


備註

督修小型水利工程

派員赴工作各縣督
修及勘查小型水利
工程

設計嘉魚鱗洲圍
鎮堤排洪工程計劃

限於經費預算原定
督修計劃未能實行

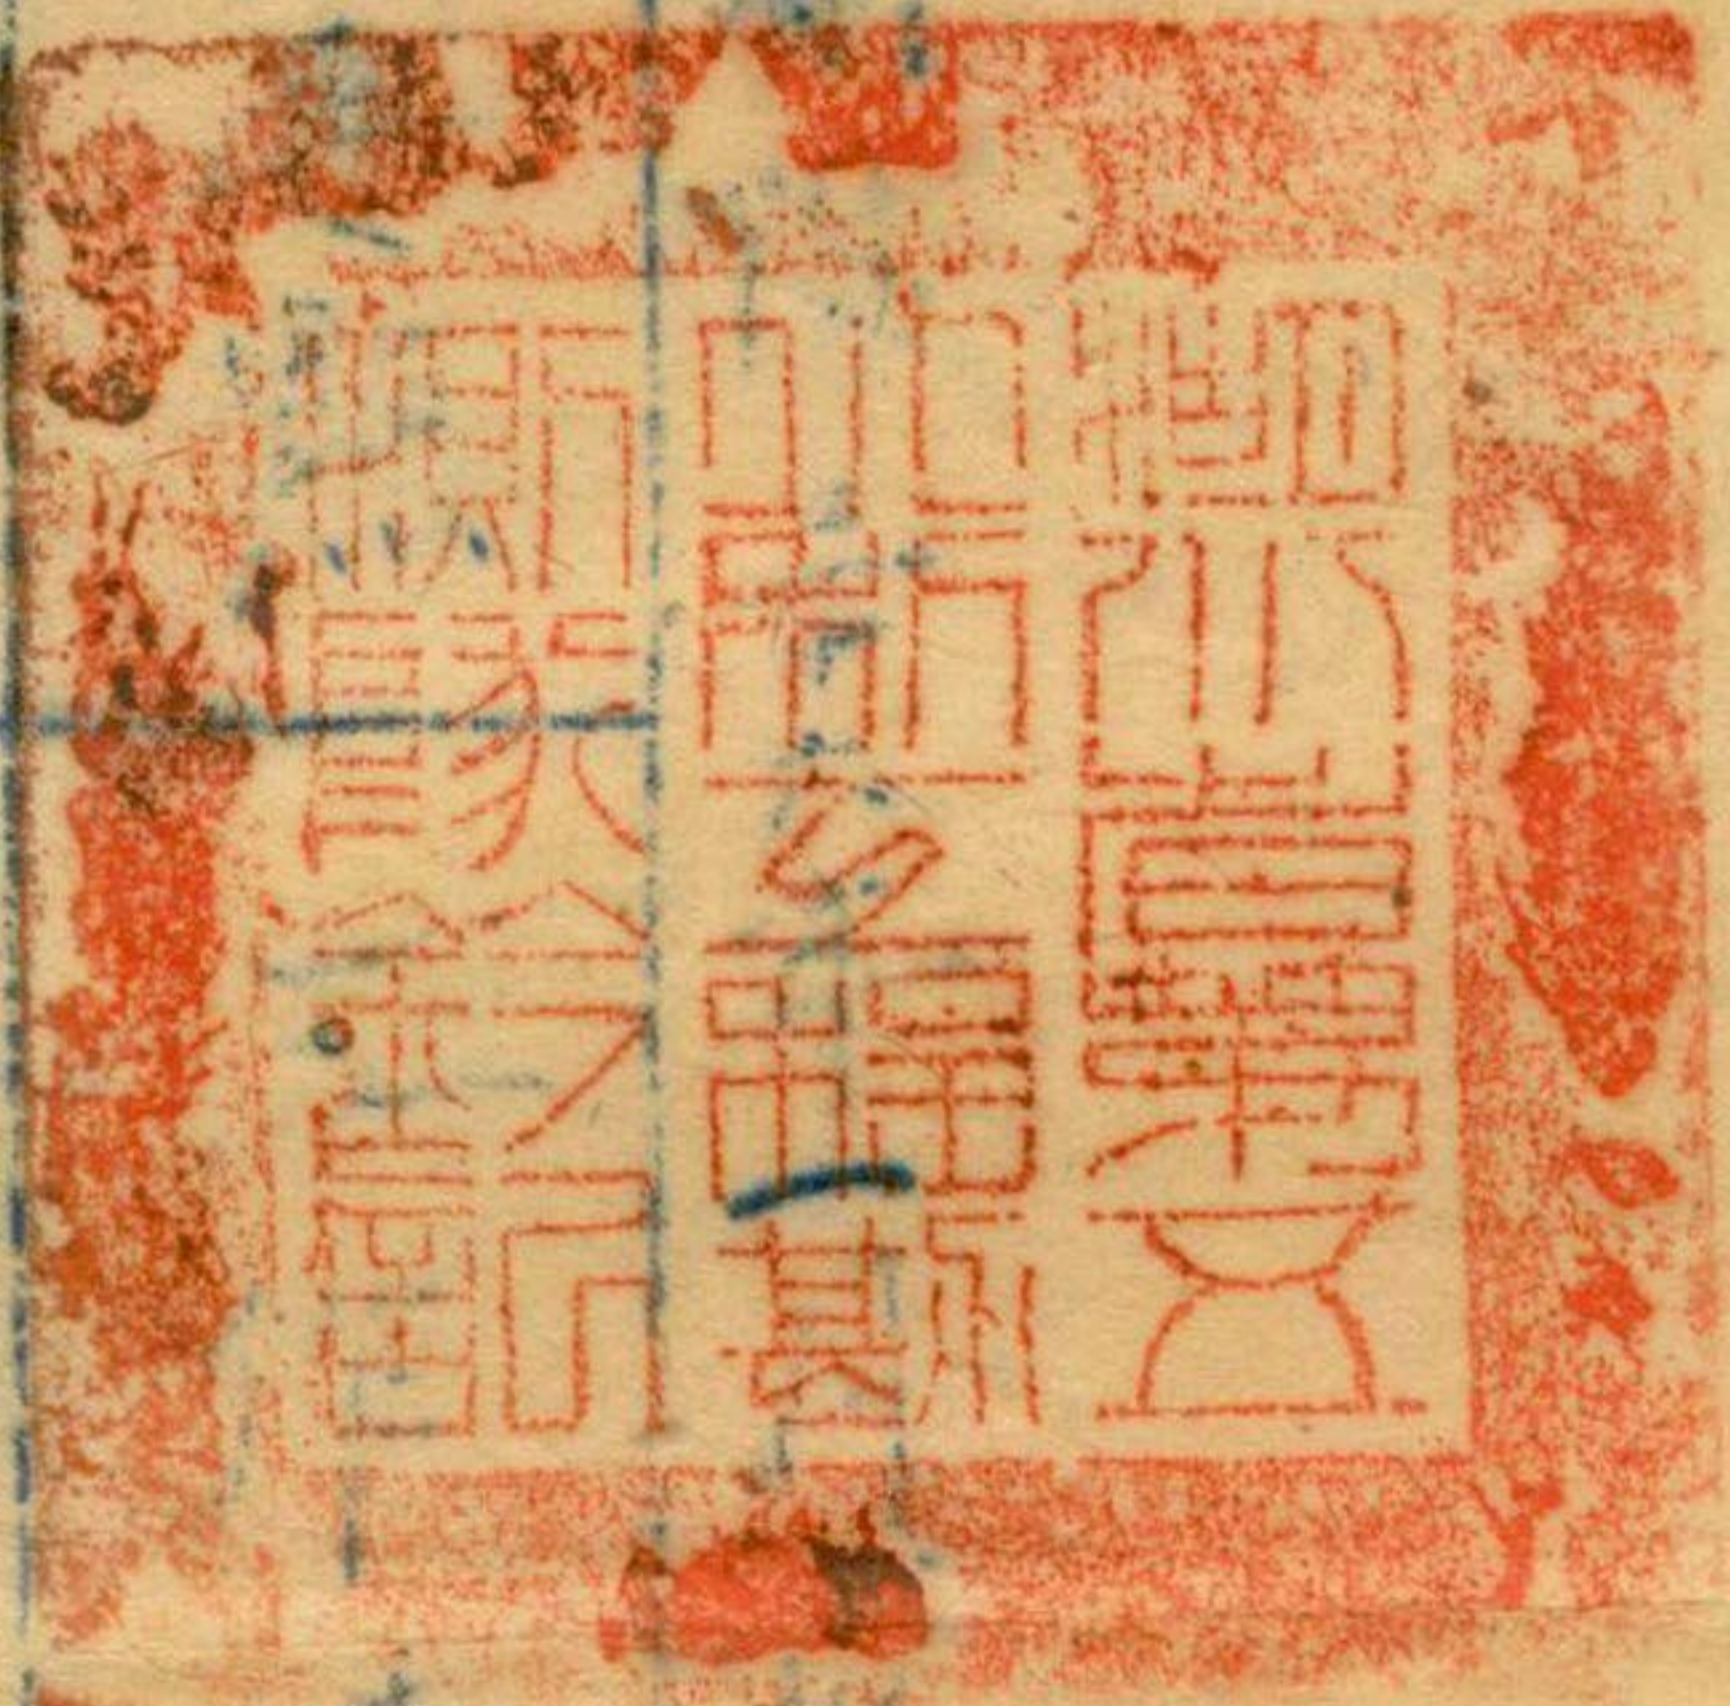

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

附註：此表係由各縣呈報，是項工作在下級機關辦理，縣政府等按月彙報，報上級機關存查。

湖北省第五水利工程計劃

項 目

原定計劃

進展比較


備 註

督修並勘查大小型水利工程

派員赴工作區各縣督修並勘查大小型水利工程

勘查漢陽姚逸鄉新豐坑灌溉工程

因限於經費未能普遍勘查

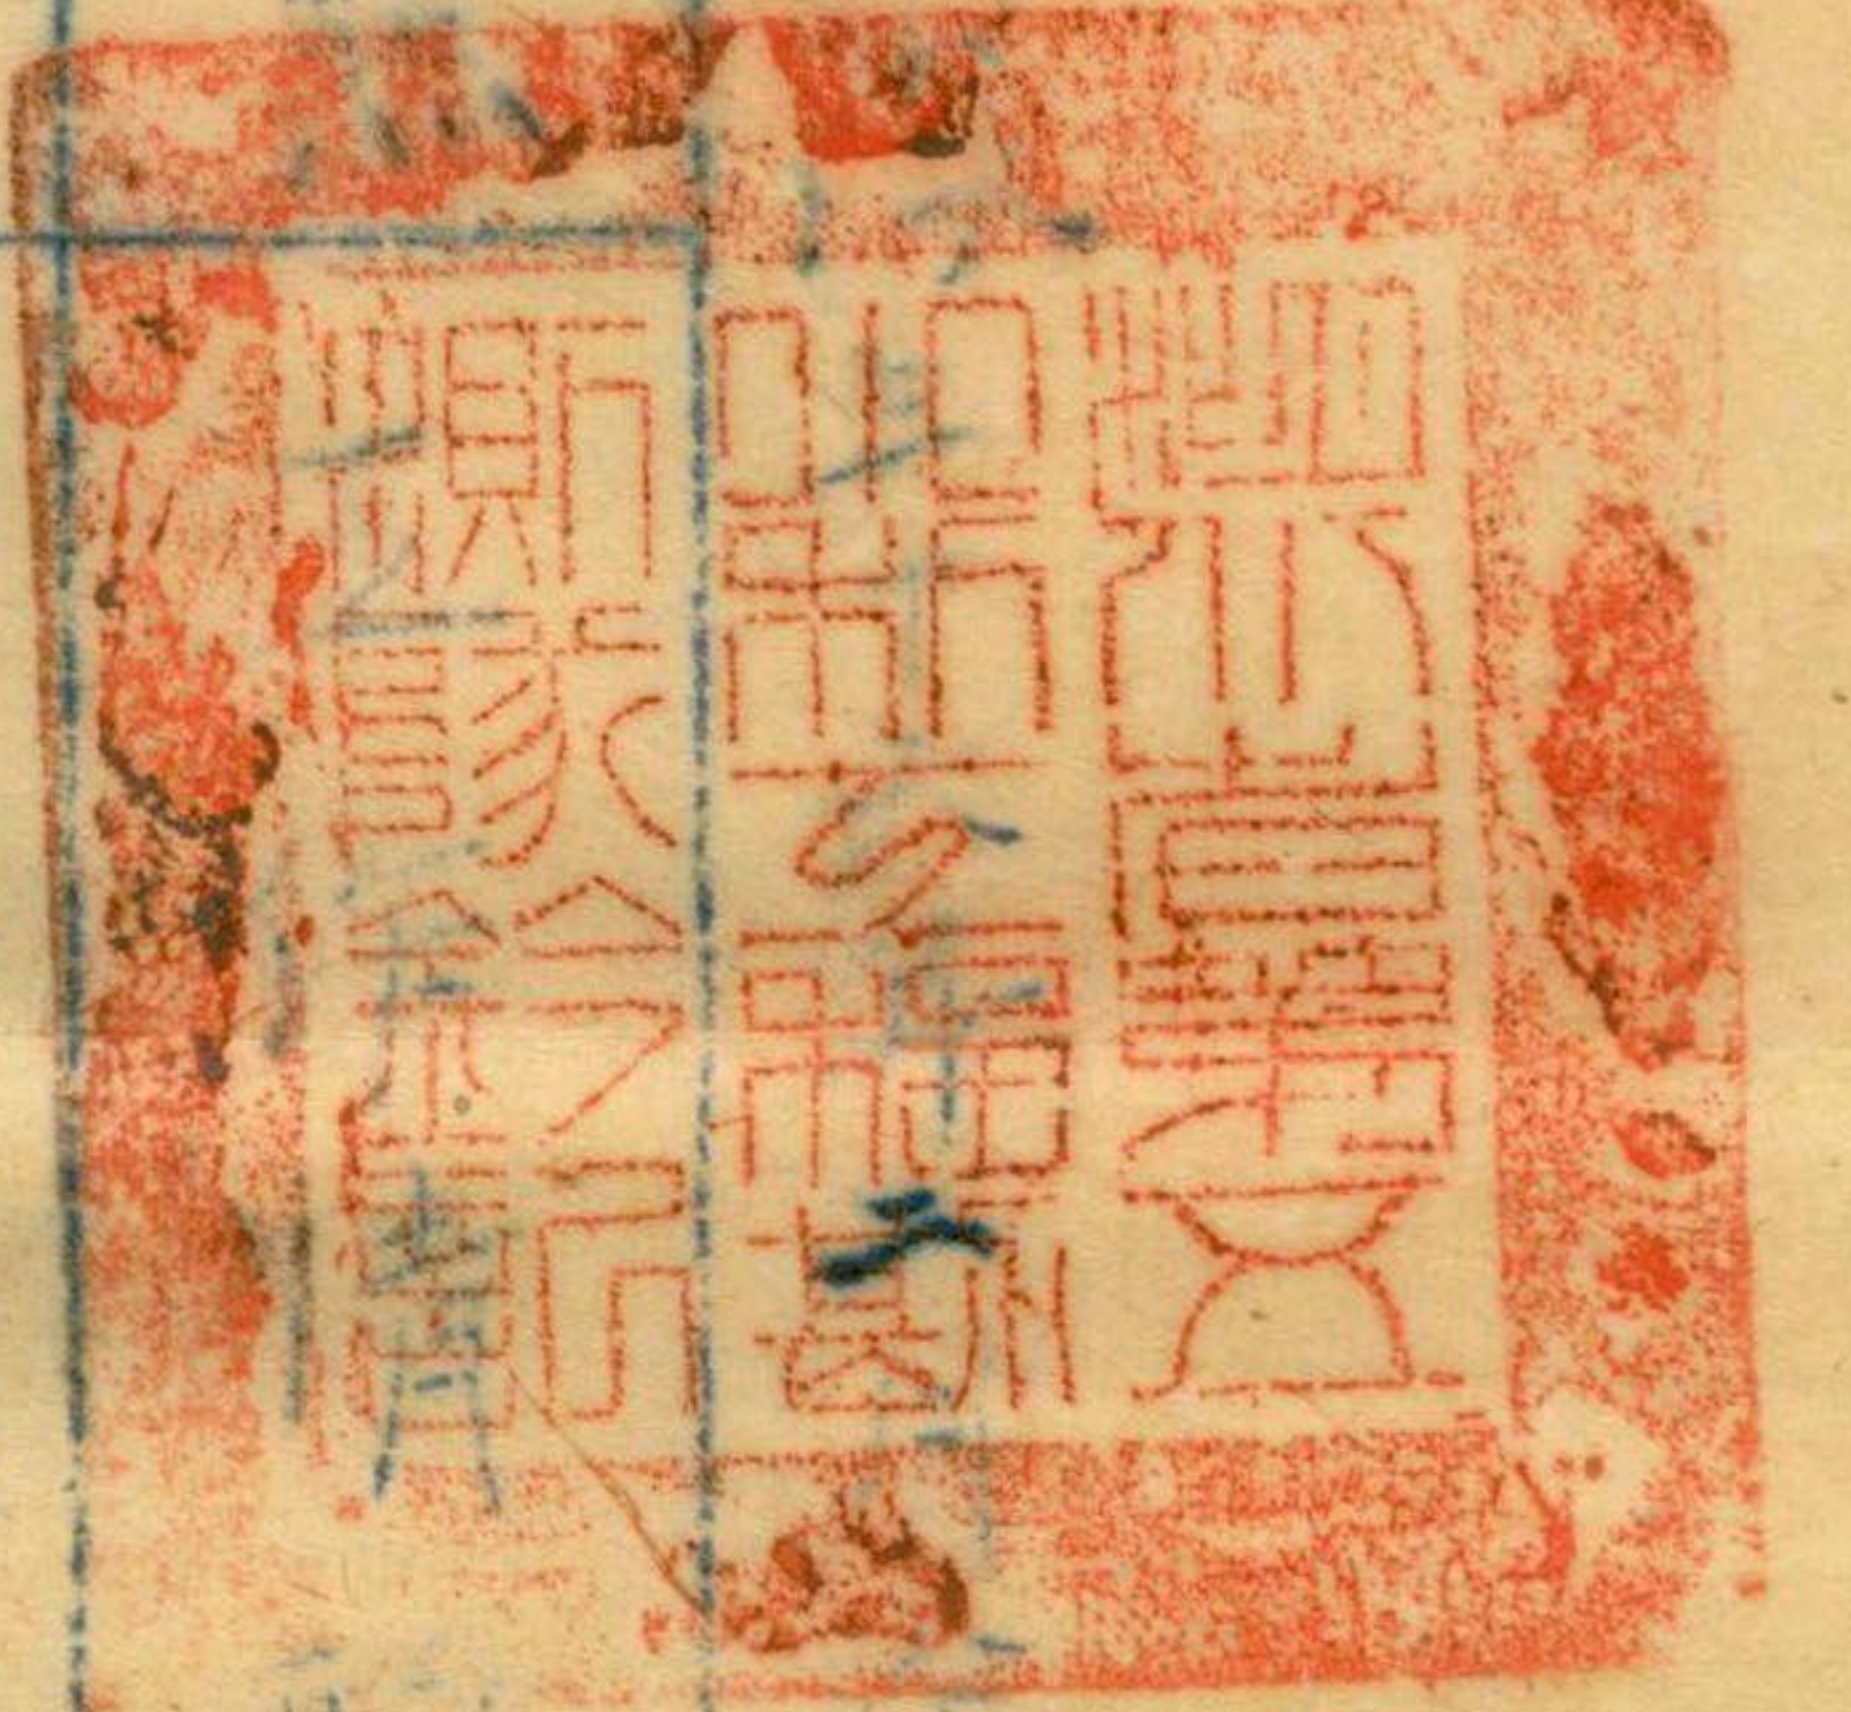

湖北省水利廳 第五工程處 五月份報表

附註：今查各縣由各縣辦理是項工作下級機關好縣政府等長片換發上級機關層
轉查之進展比較欄在工作開始第一個月內每兩月填註

湖北省檔案館

湖北省第五水利工程勘測隊
二十六年三月份
項中心工作月報表

項 目 原定計劃要點 工作情形 進展比較 備 攷

督修並勘查大小型
水利工程


派員赴工作區各縣
督修及勘查大小型
水利工程

整理蒲圻羊樓洞
水力工程圖表
蒲圻車埠分水口河
送水利年分報告

勘查旅費預算專造
未核定原定計劃等
法實施

附註
本表應由各承辦是項工作之各級機關如縣政府等按月填報上級機關層轉備查
又進展比較欄在互作開始之第一個月內毋庸填註

湖北省檔案館



湖北省第五水利工程勘測隊
 王天澤
 八項中心工作月報表

項 目

原定計畫

工作情形

進展比較

備

攷

勘查及抽驗小型水利工程

派員赴工作區各縣
 勘查並抽驗小型水利工程

勘查武昌武丰鄉漢
 澧工程
 會同視察沿江幹堤
 民堤
 抽驗鄂城黃岡等
 縣小型水利工程

鄂城歸龍鎮塘工
 懷德鄉明塘湖
 湖堤均已完工
 黃岡郭家水口至赤
 壁一段渠道正在
 着手籌辦

附註

本表應由各承辦是項工作之下級機關如縣政府等按月填報上級機關
 曾轉備查又進展比較欄在工作開始之第二個月內毋庸填寫

湖北省第五水利工程勘测

八項中心工作月報表

項

目

原定計劃

情形

進展比較

備

攷


勘查並抽驗各縣
小型水利工程

勘查鄂南湖泊
抽驗各縣小型水
利工程

續查鄂南梁子大
岩西湖完竣
抽驗廣濟黃梅等
縣小型水利工程

廣濟縣興九小型水
利工程計二十六保施
工三處抽驗七處
抽驗興興九小型水
利工程計七鄉十七處
抽驗二鄉三處

其餘如咸寧崇陽
通山通城等縣抽驗
小型水利工程工作因
查驗預算未定核
定向能實行




附註：本表應由各縣辦理是項工作三下級機關如縣政府等按月報上級機關層轉備查又進展比較欄在工作開始第一個月毋庸填註

湖北省檔案館

湖北省第五水利工程勘测队
中心工作月报表

項 目
原定計劃
情形
進展比較
備 註

勘查並抽驗小型水利工程	勘查鄂南湖泊 測量武斗鄉灌溉工程 抽驗各縣小型水利工程	勘查鄂南梁子大 泊湖 測量武斗鄉 灌溉工程 抽驗滌水大浴湯 新蕪春等縣小型 水利工程	勘查湖泊及測量武 斗鄉灌溉工程均已 辦竣 滌水與各小型水利工 程計一九四保四九九處 抽驗三土保五十八處 大冶長樂鄉第四保 圍堤已完工 陽新金油鄉王家港 壩井及大泉中花塘 壩均完工 蕪春與各小型水利工 程計四九保一百四七 處查驗桐梓新蕪 新蕪等三鄉計十八 處	各縣所填查取表尺 寸大多與實際不符 滌水縣政府與各該縣 小型水利工程能普 遍施行成績優良 應請獎勵
-------------	-----------------------------------	--	---	--



附註：
本表係由各承辦是項工作之各級機關如縣政府等按月報上級視察局
轉備查之進展比較欄在工作開始第一個月內應填註
