建設廳
第二科

88

由	擬辦	批示
擬具修復巴界段施工辦法等項斷鑒核由		

附件

鈞府省建二特字第二六零號亥灰代電飭擬具修復省縣鄉道辦法報核等因奉此除本縣縣道蘄塘路之修築計劃等項經以昌建字第三六四七號代電呈賫在案外關於奉領表列之巴界段即舊稱英武路之一段上年經將土方修復一部茲復詳細履勘測大製具調

案奉

新春縣政府呈

昌建 三十六 元 十七

53792

號發

54.12吨
387.P5
542.15

70480

附件知文

路二解元元光

中華民國廿六年[illegible]月廿九日

36 1948 (電開) 時

字號 9327

湖北省档案馆

查表並擬具施工辦法及請撥麪粉數量表理合備文一併送請

鑒核祇遵

謹呈

湖北省政府主席萬

附蘄春復路運動調查表施工辦法請撥麪粉數量表各份

蘄春縣縣長藍李昌

湖北省档案馆

89

新春縣修復區界段省道施工辦法

一、本辦法遵照 湖北省政府三十五年省建六特字第1000號訓令及附件之規定經派員會同省公局路委員實地勘測所得精確數目之之

二、本路自新廣交界之東界嶺起至新滯交界之西界嶺止全長之五、二四八公尺除上年度業已修復土方工程不計外尚須土方20,800公方砂方7,580公方共須民工92,250個

三、本路修復時期與縣道新塘路之施工時間相近附近本路之安吉安祥兩鄉已配賦新塘路修築工程各64,800名民工惟本路與其他鄉份寫遠與工不便該兩鄉仍應分配數少工程以資補助至永安鄉既未配修其他工程各屬本路附近與未配工之永安青雲二鄉之距離較遠應參照實力以均勞逸茲按五鄉劃分如次：

(1) 安祥鄉自東界嶺橋號0+000起至2+300號止共做土方砂方數為9150公方

(2) 安吉鄉自2+300號樣橋起至5+000號橋止共做土方砂方數為4950公方

(3) 青雲鄉自5+000號橋起至10+000號止共做土方砂方數為5300公方

(4) 永安鄉之甲自10+000號橋起至14+000號止共做土方砂方數為4600公方（該段土方最易砂方較各段為遠）

(5) 永安鄉之乙自14+000號橋起至25+248號禁做土方砂方數為9480公方

四、本路施工標原路舊坡及原有寬度不得改移或縮小路身其間建築物侵害本路者商由各該業主即自行遷移不得延誤

五、本路原有少數砂石應指起堆成分段隊修驗左分得歸業以資人民

六、本路橋梁涵洞為輪渡整或未發其所有石料材料不得藉機損壞以為砂方之用如有不合於規則時之際僅應由各工段負責建修賠償

七、採掘砂方應分別種類砂礫用砂之種類須呈請縣政府核准方其堆積方法高（公尺）長（公尺）底寬15公尺（公尺）面寬0.5公尺即合為（平公方）以斷滯東嶺為出發點分別堆於路上

八、各鄉應急發民工編組成隊按保隊甲班之序則造冊二份以一份送附以一份存鄉公所俟請發賑粮到縣時即按冊發放各該鄉并應注意資在做工民工以免將來有領賑粮之弊（務須淘汰老弱）

九、本路興工時期暫定自元月十日起統限於二月底一次完成如有提前完成者傳令嘉獎逾期未成者予以嚴厲處分

十、本路各橋樑涵工程由縣府請 省方修復其須民工另定之

十一、本路修復時除由縣府派員會同省公路局委員於適中地區往來指揮督導外省別各鄉并應派專員領導各保施工以期指揮便利

十二、自反石橋西岸起至西界嶺腳止內之一百公尺地區隸屬滯水縣修復

十三、本辦法自公布之日施行并呈報 省府核備

新塘公路概況圖

新州城 ⟶ 張家塘

0+000 ～ 84+500

路線全長 84.5公里
橋梁 38座
涵洞 116個

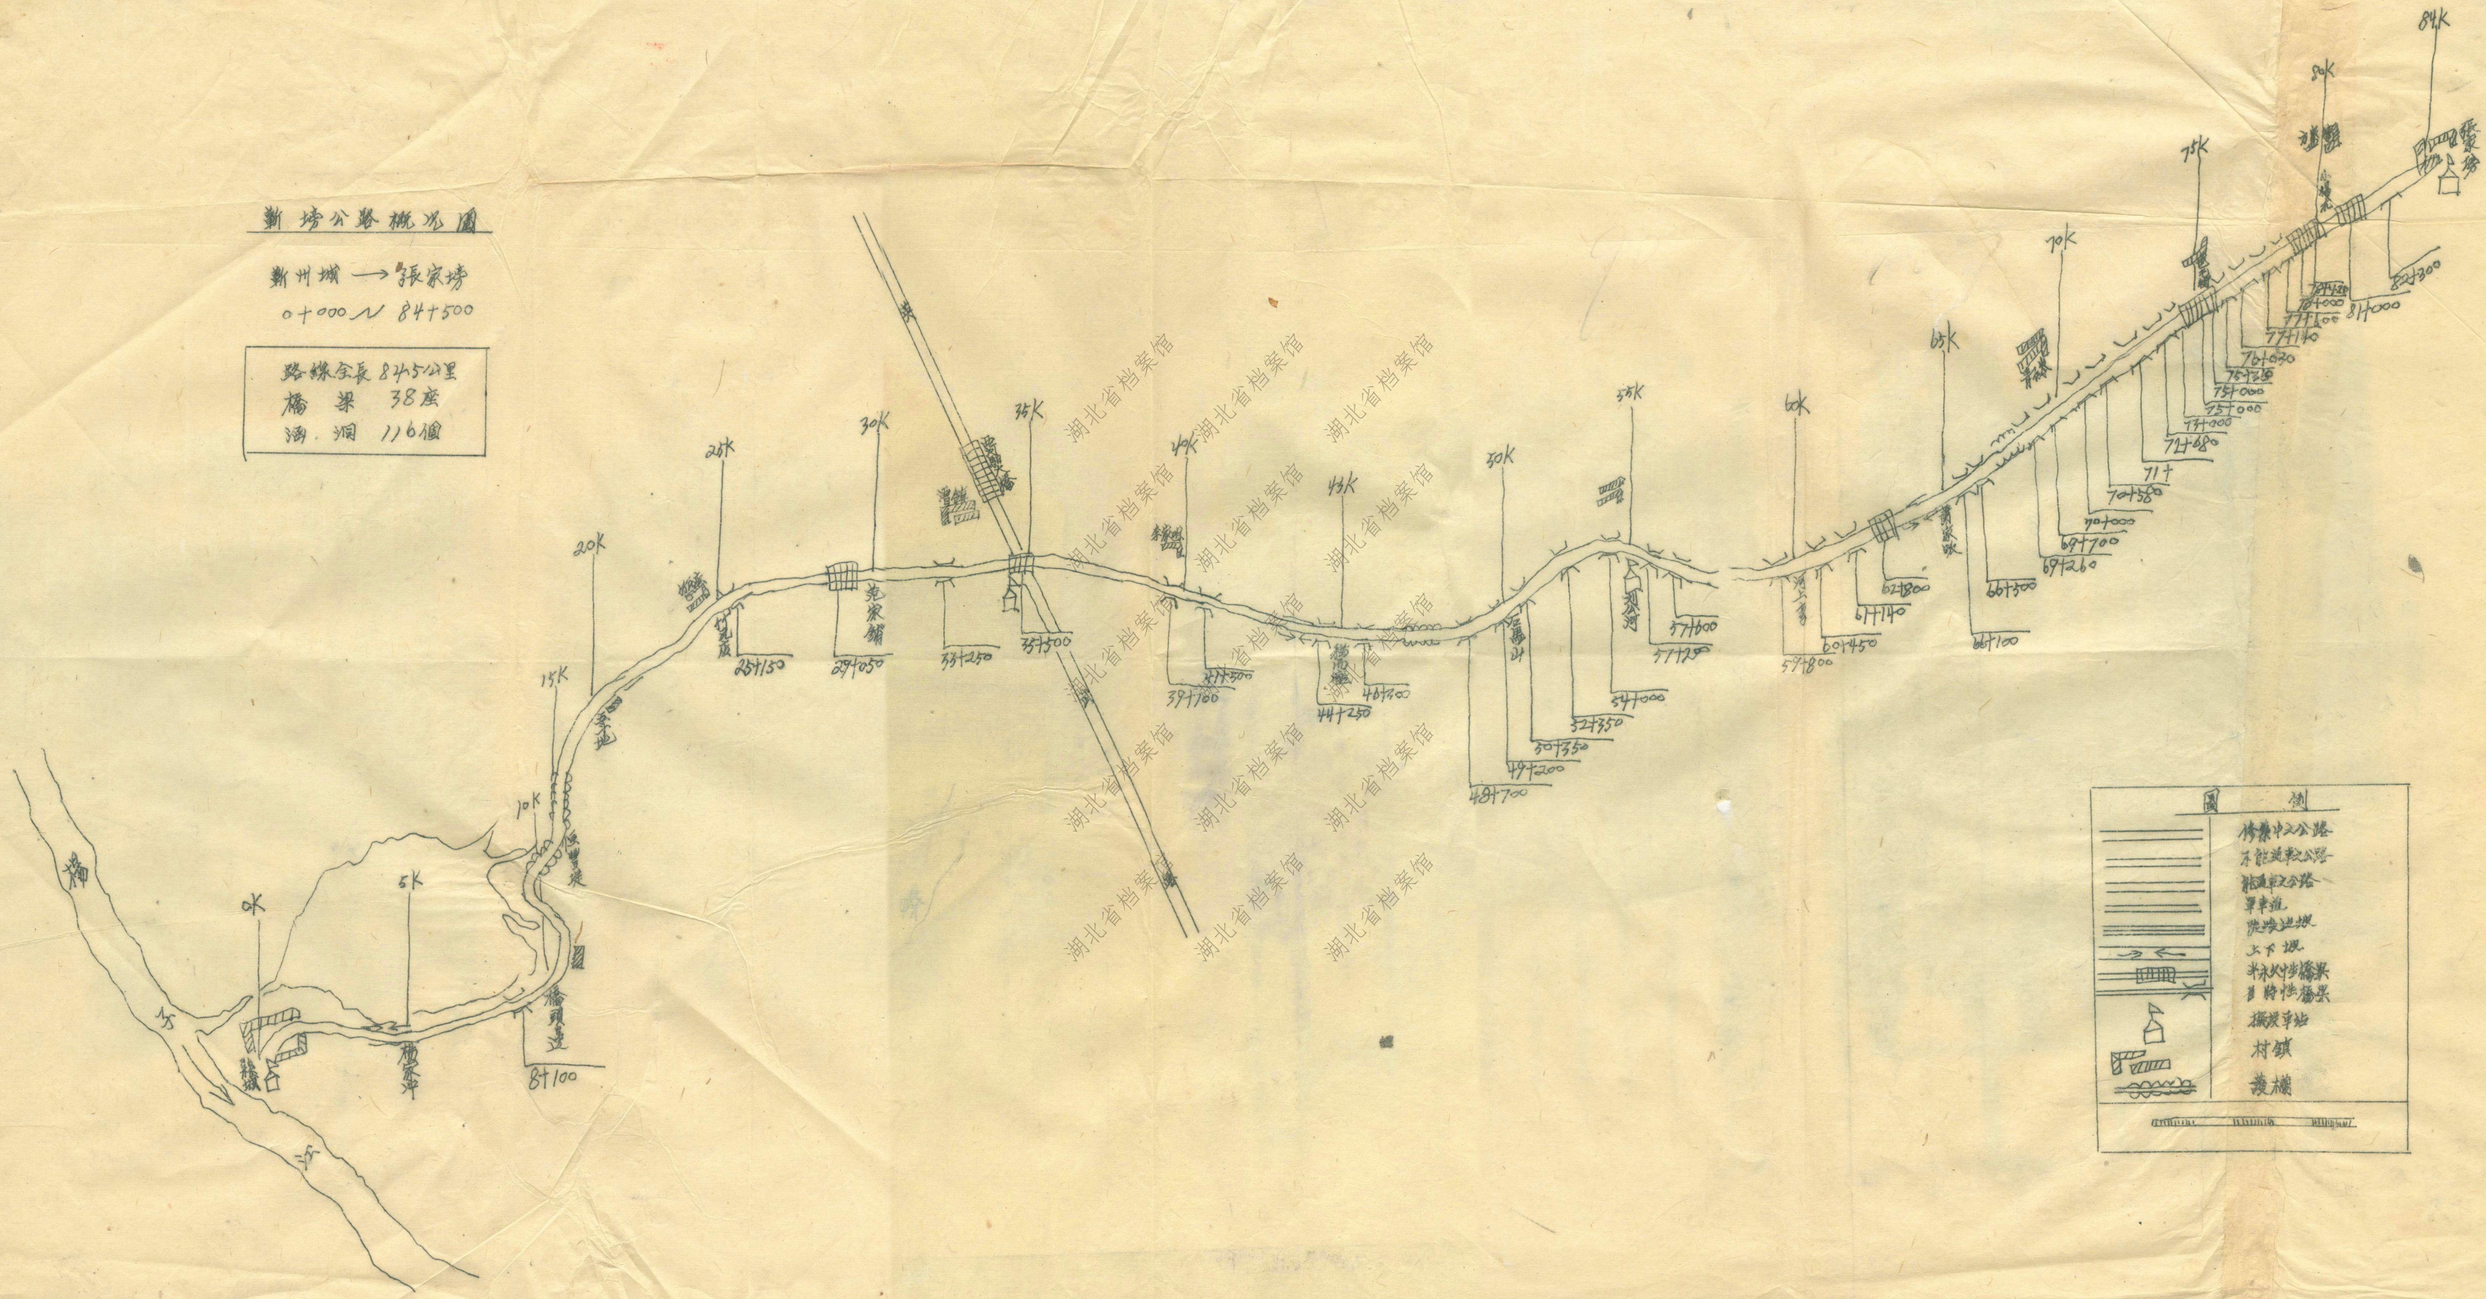

湖北省档案馆

湖北省復路運動

新春縣境省幹綫(柳界段)破壞擬修調查表

由東界嶺(新春廣濟分界)——西界嶺(新春沛水交界)

里程	23.248

36.1.5　　第一頁共三張

地名	橋號	橋(m)梁	破壞情形及形式	涵道洞	破壞情形及形式	需要土石方估計	備考
東界嶺	0+000					石方:300公方	
	0+390			1	永久式　全存	土方:	
	1+000					1500〃	
清水河	1+640			1	〃　〃	石方:	
清水河橋	1+674	5.2	混凝土獄全存		〃　〃	300〃	
	1+928			1	〃　〃	土方:	
	2+000					1400〃	
錢樓橋	2+495	3.1	〃　〃			石方:300〃	
	3+000					土方:1500〃	
	3+039			1	〃　〃		
高山鋪	3+605			1	〃　〃	〃	
	3+716			1	〃　〃		
	4+000						
	4+120			1	〃　〃		
	4+716			1	〃　半毀		
	4+898			1	〃　全存	〃	
	5+000						
	5+140				〃　〃		
	5+244			1	〃　半毀	石方:300公方	
王公湖橋	5+633	3.3	〃　〃				
	5+896			1	〃	土方:	
	6+000					1400〃	
十里鋪	6+365						
	6+730			1	〃　全存	石方:300公方	
	6+806			1	〃　〃		
	7+000					土方:1000〃	
	7+355			1	〃　〃		
	7+827			1	〃　〃	石方:500公方	
	8+000					土方:600〃	
七里橋	8+203	15	〃　四個　〃			石方:300〃	
大路鋪	9+000					土方:500	
	9+585			1	〃　〃		
	9+838			1	〃　〃	〃	
	10+000						
	10+480			1	〃　〃		
	10+712			1	〃　〃	〃	
三家店	11+000			1	〃　〃		

湖北省档案馆

	11+211			1	永久式 全存	石方=300公方	
	11+535			1	〃 〃		
	11+678			1	〃 〃		
城垠橋	11+787	14	混凝土墩三個兩個全存中墩壞3/10			土方=500〃	
	12+000						
	12+076			1	〃 〃	石方=300〃	
鄭家湖橋	12+145	5.8	混凝土墩全存				
	13+000					土方=400〃	
西河驛橋	13+038	452.6	混凝土墩7個跨度6.2m四墩全毀十六墩殘壞餘均全存稍加修理可應用			〃	
西河驛	13+350			1	〃 〃		
上驛橋	13+968	5.4	混凝土墩全存				
	14+000			1	〃		
	14+681					石方=300〃	
蓮子橋	14+862	5.2	〃 〃				
	15+000					土方=500〃	
衢家口橋	15+382	5.5	〃 〃				
乾魚嘴橋	15+808	5.5	〃			〃	
	16+000						
	16+256			1	〃 〃		
	16+529			1	〃 〃	石方=500公方	
	16+669			1	〃	土方=800〃	
	17+000						
	17+268			1	〃 〃		
	17+611			1	〃 〃	石方=300〃	
火炉鋪	17+640						
	17+925			1	〃 〃	土方=500〃	
	18+000						
	18+404			1	〃 〃	石方=300〃	
	18+642			1	〃 〃	土方=1200〃	
	19+000						
	19+074			1	〃 〃	石方=300〃	
	19+698			1	〃 〃	土方=1000〃	
	20+000						
橫車橋	20+220	19	混凝土墩四座六座全存一座損壞 1/2				

湖北省档案馆

横車橋衛	20+377			1	永久式 全存	石方:300公方	
横車小橋	20+542	3.3	混凝土墩全存			土方:500〃	
	21+000						
	21+334			1	〃 〃	〃	
叫化橋	21+745	3.85	〃 〃				
熊家衛	22+000						
熊家衛橋	22+455	4	〃 〃				
	23+000						
黄家衛橋	23+682	3.2	〃 〃				
	24+000						
灰石横	24+744	2.4	混凝土墩大部均被損壞 1/2			石方:300〃	
	25+000					土方:1000〃	
西界嶺	25+248					石方:80〃 土方:200〃	
總計		367.75	橋樑共十七座十三座橋墩全存四座橋墩須修整	39	36道全好 3道未毀	石方7,580公方 土方20,900〃	

附註、(一)需要民工32,520名石方按每十人一公方計土方按每人1.25公方計故石方需民工7,580土方需民工16,720名

(二)該段由東界嶺起1——7公里處破壞最甚路基均極高低不平之因地房屋人行道等混淆不明故需土最大其他橋涵只較易修復但路面均無樣式小之各段填平路基後即按規定計劃搬運砂方

(三)全段橋樑皆為混凝土墩跨度小者墩均存較濶者部份被毀但橋樑面板等全無

(四)所有涵道全存皆為混凝土建築僅極少數部份被毀其他祇須疏暢後即可應用。

(五)本表里程係以尺量繩丈因本縣無測量器合併陳明

湖北省档案馆

湖北新春復路運動省幹巴界段需要民工振粉數量表 三十六年元月 日

路名	民工數		工價單計(元)	工價總計(元)	工價總數折合丐粉總數(噸)	請撥發丐粉數(噸)	備考
巴界段	土方民	16720	1.500	25,080,000	836		折合丐粉相關係每三十萬元折合丐粉一噸請撥數量相關係以規數總數三分之一請撥
	砂方民	75800	1.500	113,700,000	379		
	合計	92520		113,878,000	4626	154.2	

附註：1、巴界段即原有之武英省道經過本縣全長25.248公里奉頒原表列為25公里實屬錯誤

2、本縣於三十五年六月間因駐軍請撥復路身時已將土方完成十分之四於呈奉遞轉行營令緩修下縣方才停頓

3、本表所列土方砂方民工請振數概照此次修復工程計列以前復路民工是否補發振粉未奉規定故未列入

湖北省档案馆
